




Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV



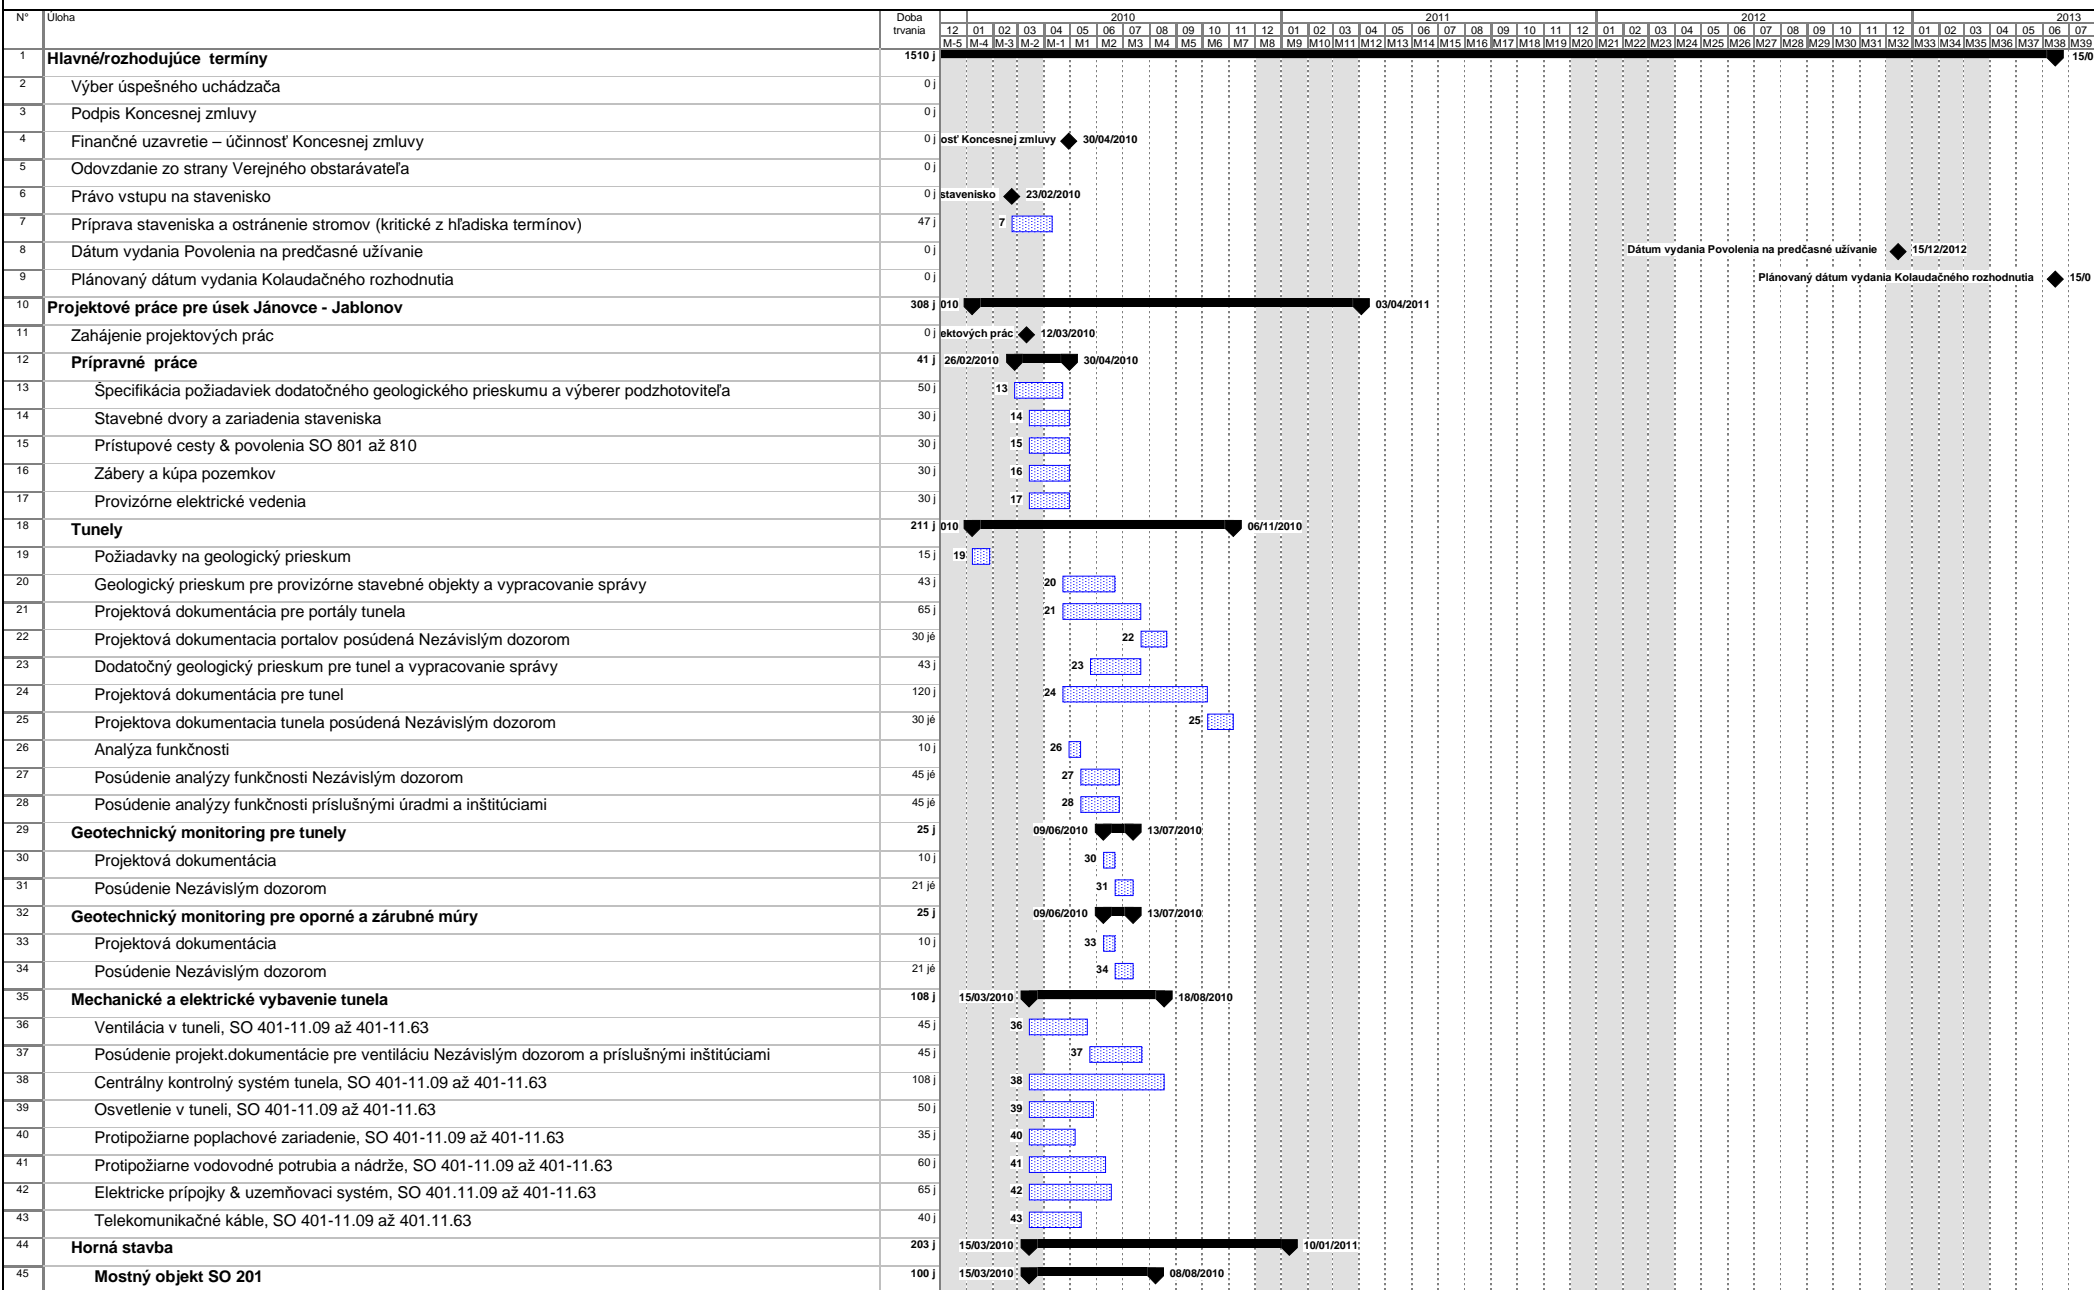

Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV

N°	Uloha	Doba trvania	2010												2011												2012												2013					
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
91	Mostný objekt SO 212	111 J	19/07/2010 → 20/12/2010																																									
92	Zakladanie a piliere	60 J																																										
93	Horná stavba	40 J																																										
94	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
95	Mostný objekt SO 213	111 J	15/03/2010 → 23/08/2010																																									
96	Špeciálne zakladanie	50 J																																										
97	Spodná stavba	40 J																																										
98	Horná stavba	80 J																																										
99	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
100	Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorum pre špeciálne zakladanie	45 Jé																																										
101	Mostný objekt SO 214	103 J	02/08/2010 → 03/01/2011																																									
102	Zakladanie a piliere	60 J																																										
103	Horná stavba	40 J																																										
104	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
105	Mostný objekt SO 215	111 J	24/05/2010 → 25/10/2010																																									
106	Zakladanie a piliere	60 J																																										
107	Horná stavba	40 J																																										
108	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
109	Mostný objekt SO 216	111 J	15/03/2010 → 23/08/2010																																									
110	Speciálne zakladanie mosta	50 J																																										
111	Spodná stavba	40 J																																										
112	Horná stavba	80 J																																										
113	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
114	Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorum pre špeciálne zakladanie	45 Jé																																										
115	Mostný objekt SO 217	111 J	10/05/2010 → 11/10/2010																																									
116	Zakladanie a piliere	60 J																																										
117	Horná stavba	40 J																																										
118	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
119	Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorum pre špeciálne zakladanie	45 Jé																																										
120	Mostný objekt SO 218	111 J	17/05/2010 → 18/10/2010																																									
121	Zaklady mosta, piliere a opory	60 J																																										
122	Horná stavba	40 J																																										
123	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
124	Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorum pre špeciálne zakladanie	45 Jé																																										
125	Mostný objekt SO 219	100 J	15/03/2010 → 08/08/2010																																									
126	Zakladanie a piliere	50 J																																										
127	Špeciálne zakladanie	40 J																																										
128	Horná stavba	80 J																																										
129	Posúdenie Nezávislým dozorum	30 Jé																																										
130	Mostný objekt SO 220	111 J	28/06/2010 → 29/11/2010																																									
131	Zakladanie a piliere	60 J																																										
132	Horná stavba	40 J																																										
133	Posúdenie Nezávislým dozorum	45 Jé																																										
134	Zárubné múry SO 229 až 239	114 J	134																																									
135	Protihlukové steny/bariéry SO 250 až 254	60 J																																										



Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV

N°	Uloha	Doba trvania	2010												2011												2012												2013					
			12 M-5	01 M-4	02 M-3	03 M-2	04 M-1	05 M	06 M2	07 M3	08 M4	09 M5	10 M6	11 M7	12 M8	01 M9	02 M10	03 M11	04 M12	05 M13	06 M14	07 M15	08 M16	09 M17	10 M18	11 M19	12 M20	01 M21	02 M22	03 M23	04 M24	05 M25	06 M26	07 M27	08 M28	09 M29	10 M30	11 M31	12 M32	01 M33	02 M34	03 M35	04 M36	05 M37
136	Odvodnenie	201 J	15/03/2010 → 06/01/2011																																									
137	Posúdenie Nezávislým dozorom	87 J	137																																									
138	Výkop rýh odvodnenia SO 501	50 J	138																																									
139	Pokládka rúrok odvodnenia SO 501	25 J	139																																									
140	Výpustný objekt SO 501	25 J	140																																									
141	Regulácia privádzača SO 501	58 J	141																																									
142	Úprava potokov & úprava vodných zdrží SO 321 až 328	43 J	142																																									
143	Prekládky inžinierskych sietí	292 J	1/2010 → 03/04/2011																																									
144	Projekt.dokumentácia a realizácia prekládok rozhodujúcich inžinierskych sietí	240 J	144																																									
145	Projekt.dokumentácia a realizácia prekládok ostatných inžinierskych sietí	80 J	145																																									
146	Iné práce	236 J	02/04/2010 → 11/01/2011																																									
147	Oplotenie SO 301	30 J	147																																									
148	Úprava hlavných ciest SO 111 až 113; SO 120 až 135	29 J	148																																									
149	Vozovky	50 J	149																																									
150	Dopravné značenie	193 J	15/03/2010 → 15/12/2010																																									
151	Informačný systém diaľnice	29 J	151																																									
152	Dopravné značky, SO 101 az 142	29 J	152																																									
153	MME (Zariadenia pre spravu a údržbu diaľnice)	72 J	30/04/2010 → 09/08/2010																																									
154	Zariadenia pre prevádzku diaľnice	72 J	154																																									
155	Verejné obstarávanie	309 J	28/06/2010 → 21/05/2011																																									
156	Diaľničná technológia	309 J	28/06/2010 → 21/05/2011																																									
157	Cesty	222 J	23/09/2010 → 21/05/2011																																									
158	Hlavné káble z optických vlákien	240 J	158																																									
159	METEO zariadenia	160 J	159																																									
160	CCTV (kamerový systém)	160 J	160																																									
161	Hláska núdzového volania	160 J	161																																									
162	Sčítacie zariadenia dopravy	160 J	162																																									
163	Tunely	244 J	28/06/2010 → 11/03/2011																																									
164	Hlavné káble z optických vlákien	240 J	164																																									
165	CCTV (kamerový systém)	160 J	165																																									
166	Hláska núdzového volania	160 J	166																																									
167	TLE	160 J	167																																									
168	Výstavba úseku Jánovce - Jablonov	912 J	13/03/2010 → 21/10/2012																																									
169	Prípravne práce	170 J	20/05/2010 → 06/11/2010																																									
170	Prístupová cesta SO 801 až 810	160 J	170																																									
171	Dodatočné zábery pozemkov	90 J	171																																									
172	Stavebné dvory a zariadenia staveniska	115 J	172																																									
173	Dčasne elektricke vedenia	30 J	173																																									
174	Zaciatok vystavby	0 J	Zaciatok vystavby 08/08/2010																																									
175	Úsek pred mostnym objektom SO 201	368 J	14/06/2010 → 05/07/2011																																									
176	Úprava jestvujúcej mimourovnovej krizovatky	61 J	176																																									
177	Zemné práce	31 J	177																																									
178	Drenážna vrstva	15 J	178																																									
179	Mostný objekt SO 201	252,13 J	08/08/2010 → 29/05/2011																																									
180	Špeciálne zakladanie	78 J	180																																									

