SECTION 3 - HUBOVÁ - IVACHNOVÁ

Nº	Task	Duration	Start	Finish
1	**Hlavné/rozhodujúce termíny**	**1539,88 j**	**16/02/09**	**15/07/13**
2	Vyhlásenie vybranej ponuky	0 j	16/02/09	16/02/09
3	Uzavretie Zmluvy	0 j	15/04/09	15/04/09
4	Finaťná závierka	0 j	15/10/09	15/10/09
5	Vydanie stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom podľa súťažnej dokumentácie	0 j	15/04/09	15/04/09
6	Právo vstupu na stavenisko	0 j	15/10/09	15/10/09
7	Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie	0 j	15/01/13	15/01/13
8	Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia	0 j	15/07/13	15/07/13
9	**Prekládky inžinierskych sietí**	**263 j**	**15/10/09**	**17/10/10**
10	Projekty a realizácia pre prekládok hlavných (väčších) inžinierskych sietí	240 j	15/10/09	17/10/10
11	Ukončenie prekládok rozhodujúcich inžinierskych sietí	0 j	17/10/10	17/10/10
12	Projekty a realizácia prekládok ostatných (menších) inžinierskych sietí	80 j	11/02/10	09/06/10
13	Ukončenie prekládok ostatných inžinierskych sietí	0 j	09/06/10	09/06/10
14	**Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Úsek č. 3, Hubová-Ivachnová**	**241 j**	**15/10/09**	**07/10/10**
15	Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre portály tunela Čebrať	55 j	15/10/09	13/01/10
16	Projekt- výpočty a realizačná dokumentácia pre portály tunela Čebrať - posúdenie nezávislým	30 jé	13/01/10	12/02/10
17	Projektová dokumentácia schválená N-I a zahájenie prác na výstavbe tunelov	0 j	12/02/10	12/02/10
18	Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre tunel Čebrať	150 j	15/10/09	02/06/10
19	Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre tunel Čebrať, posúdenie Nezávislým inžinie	30 jé	02/06/10	02/07/10
20	Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre objekty kritických mostov SO 201, 210 (kv	110 j	02/02/10	12/07/10
21	Predloženie projektov Nezávislému inžinierovi a optimistický čas odsúhlasovania pre kritické r	30 jé	12/07/10	11/08/10
22	Odsúhlasená realizačná dokumentácia pre kritické mosty, harmonogramy a ostatné ďalšie d	0 j	11/08/10	11/08/10
23	Zahájenie projektových prác na kritických mostoch	0 j	11/08/10	11/08/10
24	Zostávajúce projekty a realizačná dokumentácia	120 j	02/03/10	23/08/10
25	Posúdenie zostávajúcich projektov a realizačnej dokumentácie Nezávislým inžinierom	45 jé	23/08/10	07/10/10
26	Zahájenie ostatných projektových prác	0 j	07/10/10	07/10/10
27	**Geotechnický monitoring pre tunely**	**16 j**	**27/11/09**	**31/12/09**
28	Projektová dokumentácia	10 j	27/11/09	10/12/09
29	Posúdenie Nezávislým inžinierom	21 jé	10/12/09	31/12/09
30	**Geotechnický monitoring pre oporné múry**	**16 j**	**27/11/09**	**31/12/09**
31	Projektová dokumentácia	10 j	27/11/09	10/12/09
32	Posúdenie Nezávislým inžinierom	21 jé	10/12/09	31/12/09
33	**Mechanické a elektrické vybavenie/zariadena v tuneli**	**150,75 j**	**15/10/09**	**12/05/10**
34	Analýza funkčnosti	51 j	15/10/09	23/12/09
35	Analýza funkčnosti - posúdenie Nezávislým inžinierom	45 jé	23/12/09	06/02/10
36	Mechanické a elektrické vybavenie/zariadena v tuneli	108 j	23/11/09	12/05/10
37	Schválenie projektov pre mechanické a elektrické zariadenia tunelov Nezávislým inžinierom a	0 j	12/05/10	12/05/10
38	**Zábery pozemkov**	**100 j**	**15/10/09**	**17/03/10**
39	Predloženie výkresovej dokumentácie pre zmeny v stavebnom povolení	50 j	15/10/09	06/01/10
40	Projekty pre zábery pozemkov	30 j	15/10/09	25/11/09
41	Identifikácia majiteľov pozemkov a kontakt s nimi	30 j	15/10/09	25/11/09
42	Zabezpečenie písomného súhlasu majiteľov pozemkov	30 j	26/11/09	20/01/10
43	Administratívne potvrdenie platnosti	40 j	21/01/10	17/03/10
44	**Zariadenie staveniska /stavebný dvor**	**807 j**	**27/05/10**	**13/09/12**
45	Vybudovanie zariadenia staveniska - stavebného dvora	45 j	12/07/10	26/08/10

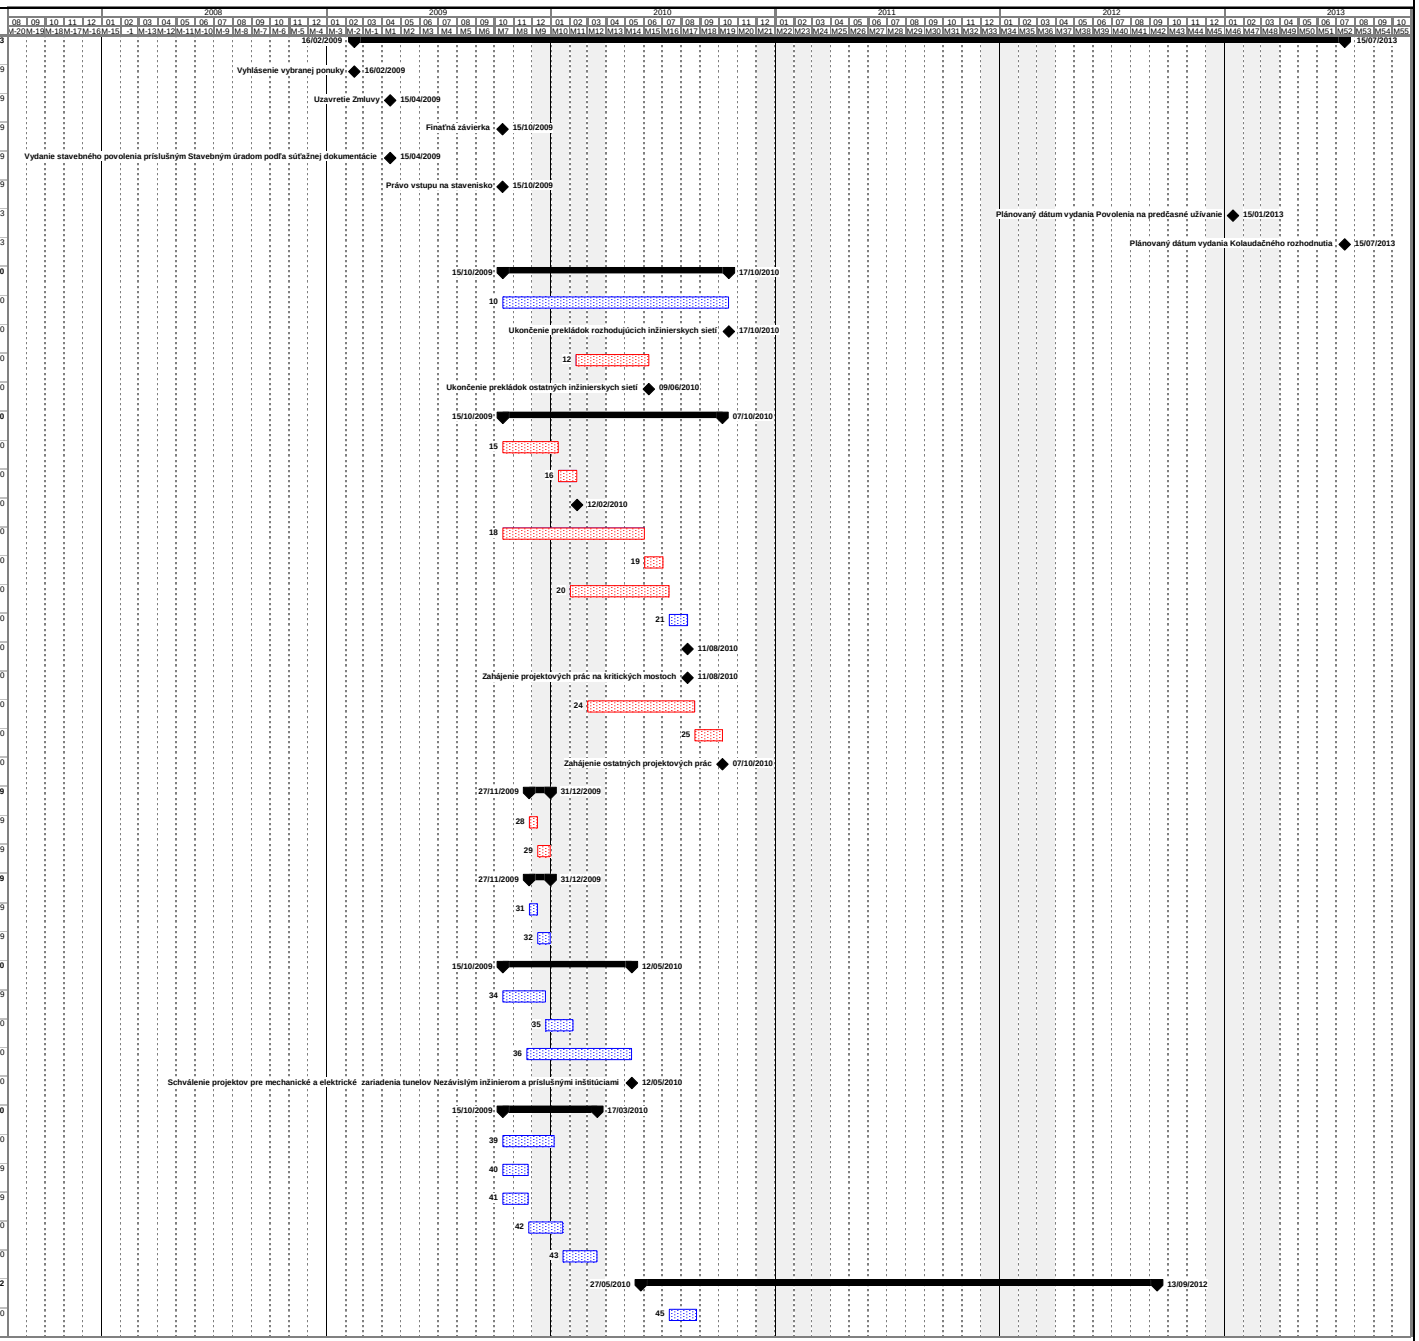

Nº	Task	Duration	Start	Finish
46	Údržba zariadenia staveniska - stavebného dvora	718 j	26/08/10	13/09/12
47	Demontáž a likvidácia zariadenia staveniska	45 j	30/07/12	13/09/12
48	Nákup štandardného zariadenia a jeho dodávka	91 j	27/05/10	26/08/10
49	**Prípravné / predbežné práce**	**120 j**	**08/10/10**	**05/04/11**
50	Prístupové cesty na stavenisko a povolenia k miestam kritických stavebných objektov	120 j	08/10/10	05/04/11
51	**Úvodný prieskum staveniska**	**152 j**	**15/10/09**	**04/06/10**
52	Geotechnický prieskum a skúšky pilót	65 j	15/10/09	27/01/10
53	Výsledky dodatočného geologického prieskumu pre portály	0 j	26/11/09	26/11/09
54	Topografický prieskum	45 j	17/11/09	02/02/10
55	Environmentálny prieskum	45 j	17/11/09	02/02/10
56	Prieskum prekládok inžinierskych sietí	45 j	17/11/09	02/02/10
57	Archeologický prieskum a iné prieskumné práce	152 j	15/10/09	04/06/10
58	**Odvodnenie a kanalizácia, SO 505-00 (z odpočívadla Ivachnová)**	**90 j**	**01/05/12**	**04/09/12**
59	Odvodnenie a kanalizácia SO 505-00	30 j	01/05/12	12/06/12
60	Prekládka vodovodu, SO 505-00	30 j	12/06/12	24/07/12
61	Objekty vodovodov a prípojky, SO 505-00 - Odlučovače ropných látok a súvisiace práce	30 j	24/07/12	04/09/12
62	**Prekládky, úpravy a rekonštrukcie jestvujúcich komunikácií**	**586,8 j**	**09/06/10**	**11/10/12**
136	**Diaľnica D1, SO 101 + Úpravy ciest v križovatkách SO 110, 111**	**592,8 j**	**07/10/10**	**15/01/13**
137	**Zemné práce**	**295,5 j**	**07/10/10**	**25/11/11**
138	Demolácie, odstraňovanie zelene, stromov a kríkov, atď.	81 j	07/10/10	03/05/11
139	Odhumusovanie	81 j	17/10/10	13/05/11
140	Odstránenie humusovej vrstvy a výkopy pre výmena podložia	259 j	17/10/10	07/11/11
141	Výkopy v trase s použitím mechanického zariadenia	261 j	17/10/10	09/11/11
142	Výkopy v trase s použitím trhavín	261 j	18/10/10	10/11/11
143	Výkopy, doprava materiálu a jeho uloženie do násypov	261 j	22/10/10	14/11/11
144	Výkopy, doprava chýbajúceho materiálu zo zemníka	261 j	22/10/10	14/11/11
145	Horná vrstva násypu z vybranej zeminy	139 j	28/06/11	14/11/11
146	Úprava podložia - svahové rebrá a vystužovanie svahov	139 j	07/07/11	23/11/11
147	Ďalšie práce na drenážnych vrstvách, separačné geotextílie, atď.	121 j	27/07/11	25/11/11
148	Súbežné obslužné cesty	30 j	24/10/11	23/11/11
149	**Odvodnenie**	**551 j**	**27/10/10**	**06/12/12**
150	**Odvodnenie diaľnice v km 0,000 - 15,275 (SO 501)**	**410 j**	**27/10/10**	**23/05/12**
151	Kanakizačné rúry HOBAS DN 300 - 1000mm	150 j	27/10/10	31/07/11
152	Prípojky do uličných vpustí	60 j	31/07/11	29/09/11
153	Ďalšie prvky/položky odvodnenia (povrchové, atď.)	150 j	31/07/11	02/05/12
154	ORL (odlučovače ropných látok) a súvisiace práce	150 j	21/08/11	23/05/12
155	**Špeciálne práce na odvodnení diaľnice v km 0,000 - 15,275 (SO 101)**	**551 j**	**27/10/10**	**06/12/12**
156	Subhorizontálne odvodňovacie vrty o priemere 108 mm	150 j	27/10/10	07/04/11
157	Stena zo štrkových pilot s priemerom 1200 mm	136 j	27/10/10	24/03/11
158	Ďalšie prvky odvodnenia (povrchové, atď.)	150 j	09/07/12	06/12/12
159	**Úpravy a regulácie povrchových tokov**	**52 j**	**27/10/10**	**07/01/11**
160	SO 321-00 - Úprava bezmenného potoka v km 2,830	10 j	27/10/10	06/11/10
161	SO 323-00 Úprava bezmenného potoka v km 6,100 – 6,167	10 j	06/11/10	16/11/10
162	SO 324-00 Úprava potoka Likavka	30 j	16/11/10	16/12/10
163	SO 325-00 Úprava bezmenného potoka v km 7,340	10 j	16/12/10	07/01/11

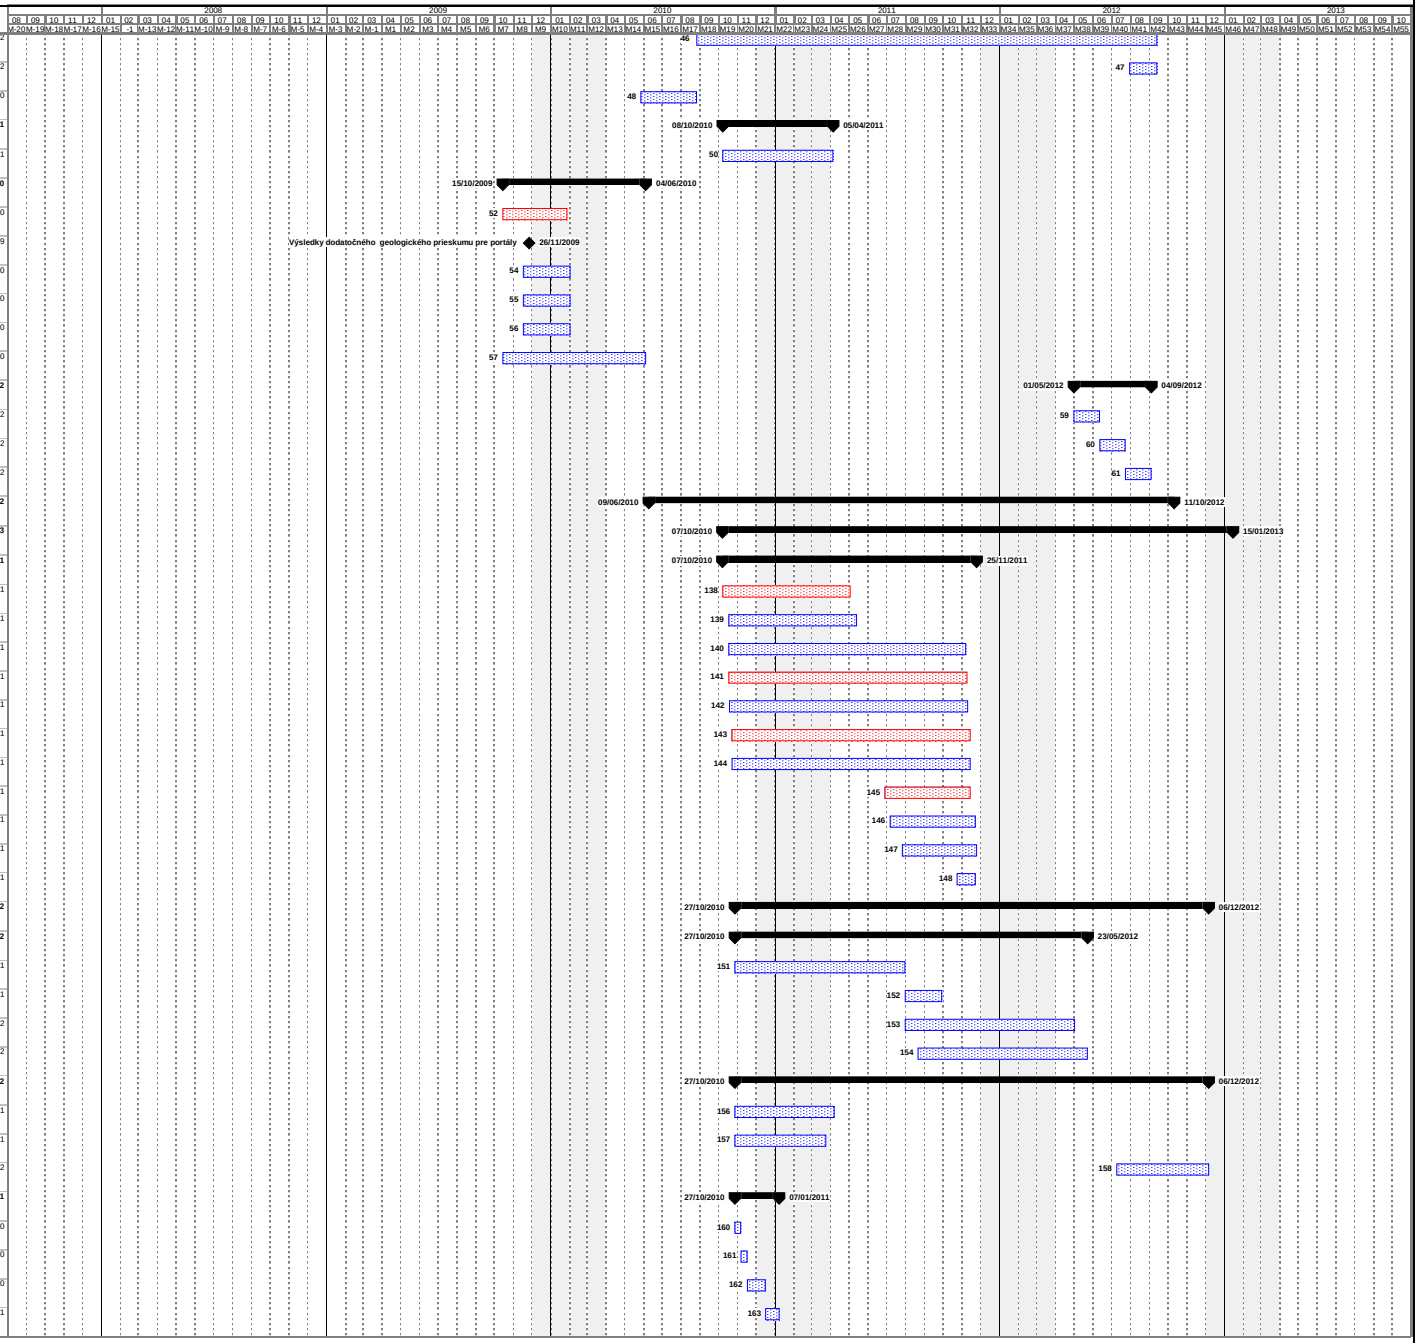

Nº	Task	Duration	Start	Finish
164	**Vozovky**	**293,45 j**	**26/07/11**	**09/09/12**
165	Podkladné vrstvy vozoviek z štrkodrviny	230 j	26/07/11	16/07/12
166	Podkladná vrstva vozoviek z cementovej stabilizácie vozoviek	230 j	02/08/11	23/07/12
167	Emulzné asfaltové postreky a adhézne spojivá medzi vrstvami	108 j	24/05/12	09/09/12
168	Kamenivo obaľované asfaltom	60 j	24/05/12	23/07/12
169	Medziľahlá vrstva asfaltovej zmesi (pojivo)	32 j	18/07/12	19/08/12
170	Asfaltová obrusná vrstva (povrch vozovky)	26 j	14/08/12	09/09/12
171	**Objekty príslušenstva diaľnice**	**586,55 j**	**17/10/10**	**15/01/13**
172	**Vegetačné úpravy**	**42,25 j**	**14/04/12**	**13/06/12**
173	Svahovanie a zahumusovanie svahov	30 j	14/04/12	14/05/12
174	Zatrávnenie, hydroosev a vegetačné úpravy na svahoch	30 j	14/05/12	13/06/12
175	**Oplotenie diaľnice**	**25 j**	**09/09/12**	**14/10/12**
176	Hlavné oplotenie	30 j	09/09/12	09/10/12
177	Ďalšie práce súvisiace s oplotením	30 j	14/09/12	14/10/12
178	**Oporné múry SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244**	**265,25 j**	**17/10/10**	**24/10/11**
179	Zariadenie pre monitoring na oporných múroch	100 j	17/10/10	01/06/11
180	Oporné múry SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244	250 j	09/11/10	24/10/11
181	Oporné múry SO 230, 232, 233, 235, 236, 237, 243, 246, 247	250 j	09/11/10	24/10/11
182	**Protihlukové steny SO 250-257, SO 315-318**	**134,5 j**	**24/05/12**	**29/11/12**
183	Zvukové bariéry	160 j	24/05/12	23/11/12
184	Ďalšie protihlukové opatrenia	160 j	30/05/12	29/11/12
185	**ISD (Informačný systém diaľnice) SO 690, 691, 692**	**168 j**	**24/05/12**	**15/01/13**
186	ISD (Informačný systém diaľnice) SO 690, 691, 692	168 j	24/05/12	15/01/13
187	**Prvky dopravného značenia a zaistenia bezpečnosti premávky**	**34 j**	**26/07/12**	**12/09/12**
188	Vodorovné dopravné značenie	7 j	05/09/12	12/09/12
189	Zvislé dopravné značky	22,88 j	17/08/12	12/09/12
190	Oceľové a betónové (New Jersey) zvodidlá	42 j	26/07/12	12/09/12
191	**Mosty**	**670,93 j**	**13/05/10**	**06/12/12**
192	Základy a piliere pred zahájením prác na mostovke (všetky mosty okrem SO 210)	126 j	11/08/10	29/01/11
193	Ukončenie prác na mostovke a mostoch (všetky mosty okrem SO 210)	86 j	30/08/12	06/12/12
194	**Mostný objekt SO 201 (inkrementálne vysúvanie)**	**354,75 j**	**06/11/10**	**16/03/12**
195	**Betonáž mostovkovej dosky**	**354,75 j**	**06/11/10**	**16/03/12**
196	Technológia inkrementálneho vysúvania - 2 páry malých vozíkov	330 j	06/11/10	16/03/12
197	Technológia inkrementálneho vysúvania- 1 pár stredných vozíkov	198 j	23/11/10	08/09/11
198	**Mostný objekt SO 204 (výsuvná/pohyblivá skruž - posuvné debnenie)**	**345 j**	**28/02/11**	**24/06/12**
199	**Betonáž mostovkovej dosky**	**345 j**	**28/02/11**	**24/06/12**
200	Zariadenie dovezené z Úseku č.4	0 j	28/02/11	28/02/11
201	Technológia letmej betonáže - 2 páry (malé) zariadenia	198 j	28/02/11	02/11/11
202	Technológia letmej betonáže - 1 pár (stredné) zariadenia	198 j	09/09/11	24/06/12
203	**Mostný objekt SO 207 (výsuvná skruž)**	**221 j**	**15/04/11**	**19/02/12**
204	**Betonáž mostovkovej dosky**	**221 j**	**15/04/11**	**19/02/12**
205	Zariadenie dovezené z Úseku č.4 (Mostný objekt SO 217)	0 j	15/04/11	15/04/11
206	Metóda pohyblivej / výsuvnej skruže - stredné do 45 m rozpätia - 1 celok	231 j	15/04/11	19/02/12
207	**Mostný objekt SO 210 (výsuvná/pohyblivá skruž - posuvné debnenie)**	**464 j**	**17/10/10**	**26/07/12**

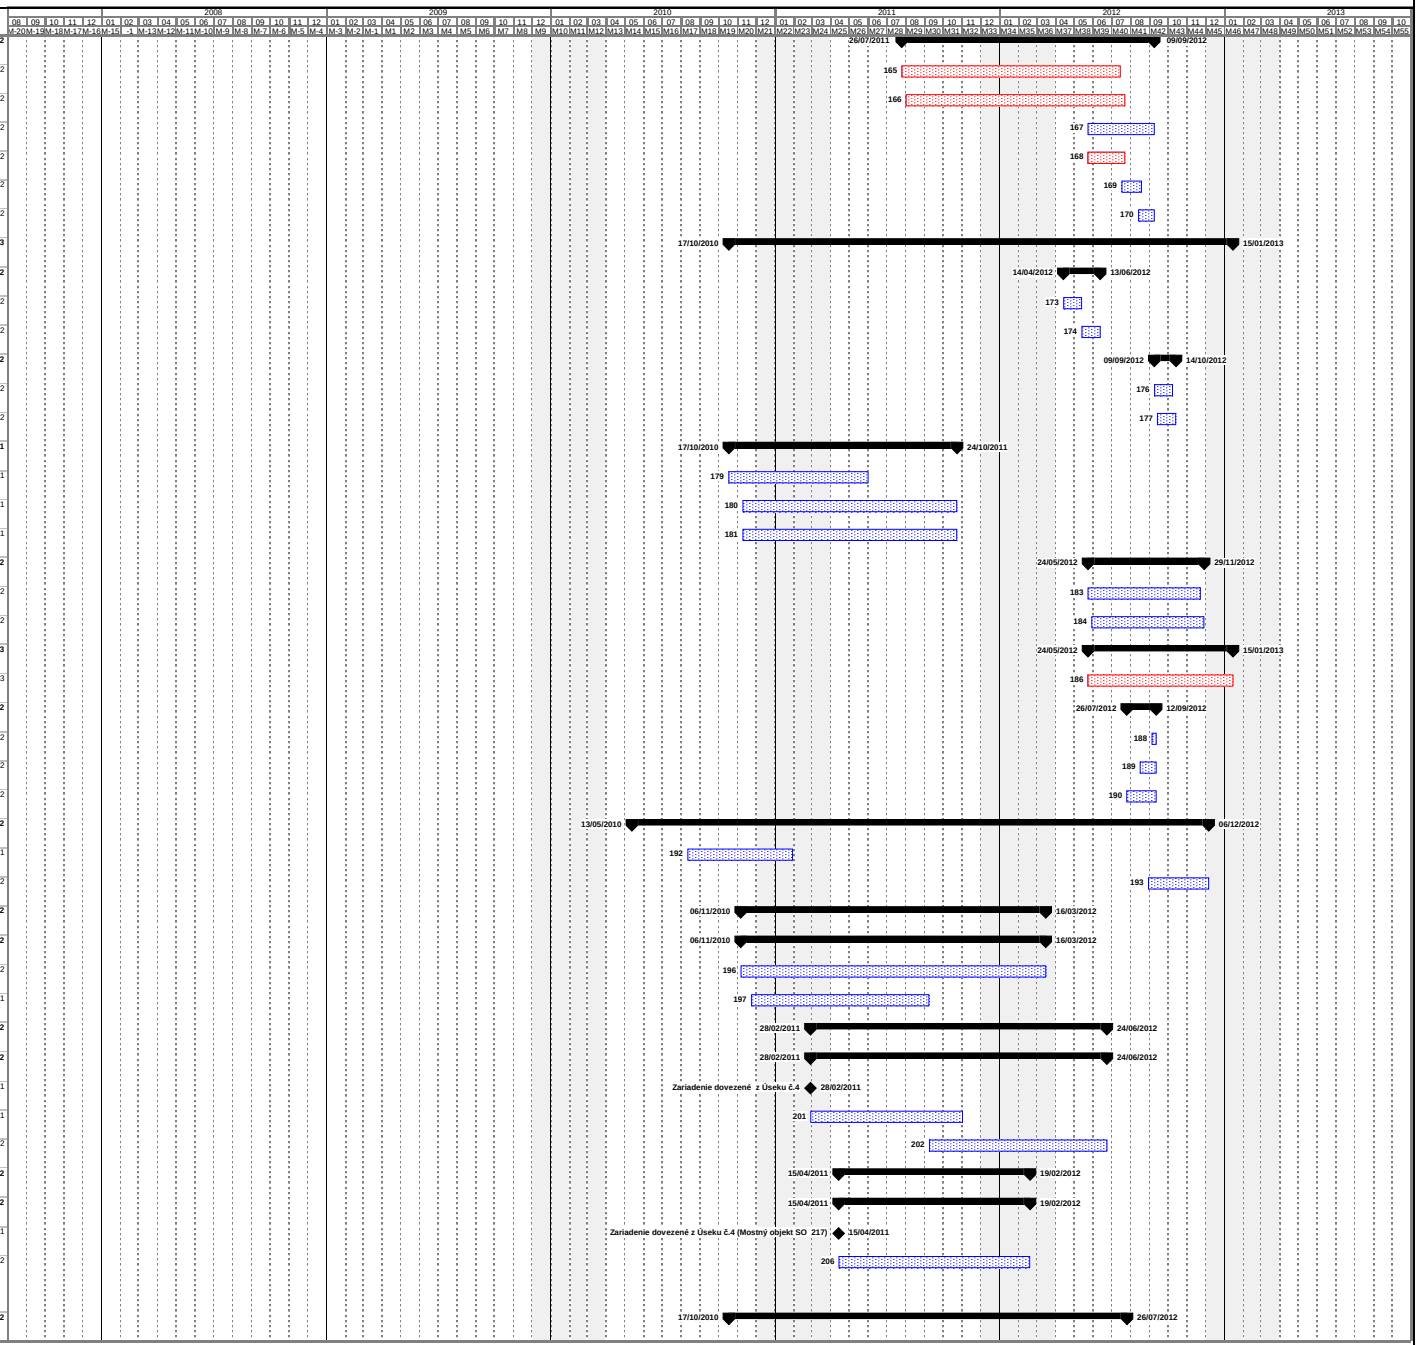

Nº	Task	Duration	Start	Finish
208	Základy a piliere pred začatím prác na mostovkovej doske (len most SO 210)	76	17/10/10	23/02/11
209	**Betonáž mostovkovej dosky**	**264,75**	**15/04/11**	**19/04/12**
210	Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO 211)	0	15/04/11	15/04/11
211	Metóda pohyblivej / výsuvnej skruže - stredné do 45 m rozpätia - 1 celok	264	15/04/11	19/04/12
212	Ukončenie prác na mostovkovej doske a mostoch (len most SO 210)	86	19/04/12	26/07/12
213	**Mostný objekt SO 213 (letmá betonáž)**	**321,88**	**06/11/10**	**31/01/12**
214	**Betonáž mostovkovej dosky**	**321,88**	**06/11/10**	**31/01/12**
215	Technológia letmej betonáže - 2 páry (veľké) zariadenia	317	06/11/10	31/01/12
216	**Mostný objekt SO 214 (výsuvná skruž)**	**372**	**11/04/11**	**10/05/12**
217	**Betonáž mostovkovej dosky**	**372**	**11/04/11**	**10/05/12**
218	Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO 215)	0	11/04/11	11/04/11
219	Metóda výsuvnej skruže - veľké až do 59.2 m rozpätia 1	286	11/04/11	10/05/12
220	**Mostný objekt SO 216 (konštrukcie zo segmentov PDK)**	**342**	**13/05/10**	**03/09/11**
221	Základy a piliere pred začatím prác na mostovkovej doske so skorším schválením	76	13/05/10	07/08/10
222	Betonáž mostovkovej dosky	242	04/07/10	09/06/11
223	Izolácie proti vode	43	09/06/11	22/07/11
224	Vozovka na moste	43	22/07/11	03/09/11
225	**Mostný objekt SO 203**	**266,25**	**07/10/10**	**16/10/11**
226	Špeciálne zakladanie	65	07/10/10	20/12/10
227	Spodná stavba	87	27/11/10	08/05/11
228	Horná stavba	87	08/04/11	22/07/11
229	Izolácie proti vode	43	23/07/11	03/09/11
230	Vozovka na moste	43	04/09/11	16/10/11
231	**Mostný objekt SO 206**	**219,88**	**21/12/10**	**24/10/11**
232	Špeciálne zakladanie	22	21/12/10	26/02/11
233	Spodná stavba	109	26/02/11	21/07/11
234	Horná stavba	43	21/07/11	08/09/11
235	Izolácie proti vode	12	09/09/11	20/09/11
236	Vozovka na moste	34	21/09/11	24/10/11
237	**Mostný objekt SO 208**	**101,63**	**26/02/11**	**19/07/11**
238	Spodná stavba	22	26/02/11	07/04/11
239	Horná stavba	65	07/04/11	26/06/11
240	Vozovka na moste	23	26/06/11	19/07/11
241	**BRIDGE 209**	**91,75**	**07/04/11**	**13/08/11**
242	Spodná stavba	22	07/04/11	08/05/11
243	Horná stavba	65	08/05/11	21/07/11
244	Vozovka na moste	23	21/07/11	13/08/11
245	**Mostný objekt SO 211**	**123,13**	**08/05/11**	**27/10/11**
246	Špeciálne zakladanie	22	08/05/11	02/06/11
247	Spodná stavba	44	02/06/11	22/07/11
248	Horná stavba	44	22/07/11	11/09/11
249	Izolácie proti vode	22	11/09/11	03/10/11
250	Vozovka na moste	24	03/10/11	27/10/11
251	**BRIDGE 212**	**121,63**	**02/06/11**	**21/11/11**
252	Špeciálne zakladanie	22	02/06/11	27/06/11

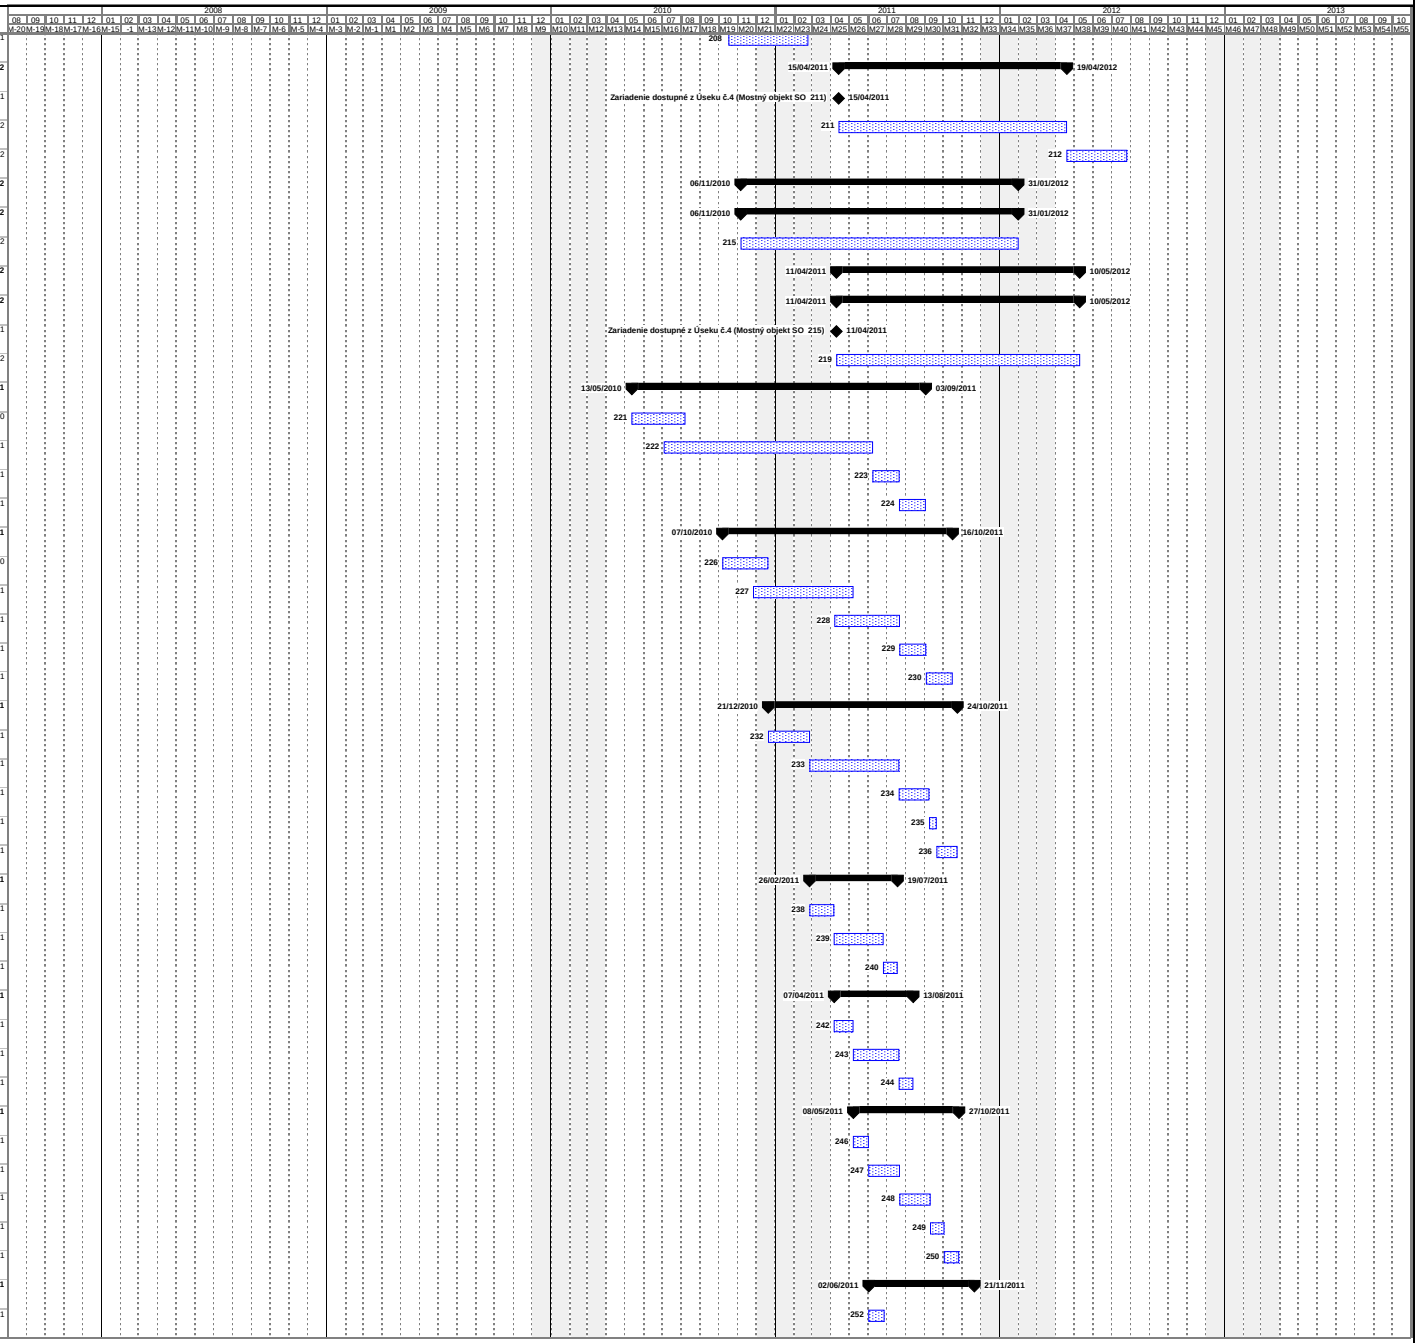

Nº	Task	Duration	Start	Finish
253	Spodná stavba	44	27/06/11	16/08/11
254	Horná stavba	44	17/08/11	06/10/11
255	Izolácie proti vode	22	06/10/11	28/10/11
256	Vozovka na moste	24	28/10/11	21/11/11
257	**BRIDGE 215**	**490,38**	**03/09/10**	**20/07/12**
258	Špeciálne zakladanie	110	03/09/10	18/02/11
259	Spodná stavba	168	23/10/10	05/07/11
260	Horná stavba	371	11/12/10	13/06/12
261	Izolácie proti vode	152	25/09/11	28/06/12
262	Vozovka na moste	22	29/06/12	20/07/12
263	**Mostný objekt SO 217**	**252,13**	**07/10/10**	**26/09/11**
264	Horná stavba	87	07/10/10	26/02/11
265	Izolácie proti vode	87	01/04/11	02/07/11
266	Vozovka na moste	43	03/07/11	14/08/11
267	Vozovka na moste	43	15/08/11	26/09/11
268	**Mostný objekt SO 218**	**325,88**	**18/02/11**	**20/05/12**
269	Špeciálne zakladanie	65	18/02/11	24/05/11
270	Spodná stavba	87	29/04/11	06/08/11
271	Horná stavba	87	13/07/11	21/10/11
272	Izolácie proti vode	43	21/10/11	07/04/12
273	Vozovka na moste	43	07/04/12	20/05/12
274	**Mostný objekt SO 219**	**146,13**	**07/10/10**	**29/04/11**
275	Spodná stavba	22	07/10/10	01/11/10
276	Horná stavba	65	01/11/10	26/02/11
277	Vozovka na moste	23	01/04/11	29/04/11
278	**Mostný objekt SO 220**	**133,38**	**01/11/10**	**06/05/11**
279	Spodná stavba	22	01/11/10	26/11/10
280	Horná stavba	65	27/11/10	07/04/11
281	Vozovka na moste	23	07/04/11	06/05/11
282	**Mostný objekt SO 221**	**131,38**	**27/11/10**	**31/05/11**
283	Spodná stavba	22	27/11/10	18/01/11
284	Horná stavba	65	18/01/11	08/05/11
285	Vozovka na moste	23	08/05/11	31/05/11
286	**Mostný objekt SO 222**	**123,5**	**24/05/11**	**12/11/11**
287	Špeciálne zakladanie	22	24/05/11	18/06/11
288	Spodná stavba	44	18/06/11	07/08/11
289	Horná stavba	44	07/08/11	27/09/11
290	Izolácie proti vode	22	27/09/11	19/10/11
291	Vozovka na moste	24	19/10/11	12/11/11
292	**Mostný objekt SO 223**	**269,88**	**18/06/11**	**29/06/12**
293	Špeciálne zakladanie	65	18/06/11	31/08/11
294	Spodná stavba	87	06/08/11	14/11/11
295	Horná stavba	87	21/10/11	24/03/12
296	Izolácie proti vode	43	05/04/12	17/05/12
297	Vozovka na moste	43	18/05/12	29/06/12

Nº	Task	Duration	Start	Finish
298	**Mostný objekt SO 224**	**113,88 j**	**18/01/11**	**25/06/11**
299	Spodná stavba	22 j	18/01/11	27/02/11
300	Horná stavba	65 j	27/02/11	02/06/11
301	Vozovka na moste	23 j	02/06/11	25/06/11
302	**Tunnel Čebrať SO 401**	**597,88 j**	**01/04/10**	**16/07/12**
303	**Portály tunela**	**502,88 j**	**01/04/10**	**05/03/12**
304	Zariadenie pre monitoring v tuneloch	40 j	01/04/10	17/05/10
305	**Západný portál**	**62,25 j**	**30/06/10**	**26/09/10**
306	Odstránenie humusu	86 j	30/06/10	24/09/10
307	Výkopy	86 j	01/07/10	25/09/10
308	Klincovanie a zemné kotvy	86 j	02/07/10	26/09/10
309	Primárne ostenie (striekaný betón)	120 j	28/08/11	05/01/12
310	**Východný portál**	**62,25 j**	**30/06/10**	**26/09/10**
311	Odstránenie humusu	86 j	30/06/10	24/09/10
312	Výkopy	86 j	01/07/10	25/09/10
313	Klincovanie a zemné kotvy	86 j	02/07/10	26/09/10
314	Primárne ostenie (striekaný betón)	180 j	28/08/11	05/03/12
315	**Razenie tunela**	**271 j**	**31/12/10**	**14/01/12**
316	Tunelovacie raziace zariadenie dostupné z Úsejku č.4	0 j	31/12/10	31/12/10
317	Južná tunelová rúra	360 j	03/01/11	14/01/12
318	Severná tunelová rúra	360 j	03/01/11	14/01/12
319	**Vybudovanie ostenia**	**276 j**	**18/03/11**	**07/04/12**
320	Zariadenie na budovanie ostenia dostupné z Úseku č.4	0 j	18/03/11	18/03/11
321	Južná tunelová rúra	149 j	27/10/11	07/04/12
322	Severná tunelová rúra	149 j	27/10/11	07/04/12
323	**Vozovky**	**101 j**	**06/01/12**	**27/05/12**
324	Južná tunelová rúra	139 j	06/01/12	27/05/12
325	Severná tunelová rúra	139 j	06/01/12	27/05/12
326	**Technologický tunel**	**105,88 j**	**20/02/12**	**16/07/12**
327	Južná tunelová rúra	144 j	20/02/12	16/07/12
328	Severná tunelová rúra	144 j	20/02/12	16/07/12
329	**Odpočívadlo Ivachnová (Pk 15,700)**	**210 j**	**25/11/11**	**14/09/12**
330	Zemné práce	60 j	25/11/11	29/05/12
331	Odvodnenie a iné súvisiace položky	60 j	29/05/12	28/07/12
332	Oplotenie a dalšie práce (nie odvodnenie, pozri SO 505)	10 j	04/09/12	14/09/12
333	**Diaľničná technológia**	**197,55 j**	**24/01/12**	**25/10/12**
334	Príslušenstvo diaľnice	110 j	24/05/12	11/09/12
335	Nábor pracovníkov	60 j	18/05/12	17/07/12
336	**Obdobie pred skúšobnou prevádzkou - lokálne testy a skúšky**	**197,55 j**	**24/01/12**	**25/10/12**
337	Južná tunelová rúra	30 j	17/07/12	15/08/12
338	Severná tunelová rúra	30 j	17/07/12	15/08/12
339	Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariadenia	0 j	24/01/12	24/01/12
340	Zapojenie softvéru pre vybavenie a zariadenia na Úseku č.3	121 j	14/03/12	17/07/12
341	Ostatné / ďalšie	44 j	11/09/12	25/10/12
342	**Skúšobná prevádzka**	**51,55 j**	**04/11/12**	**15/01/13**

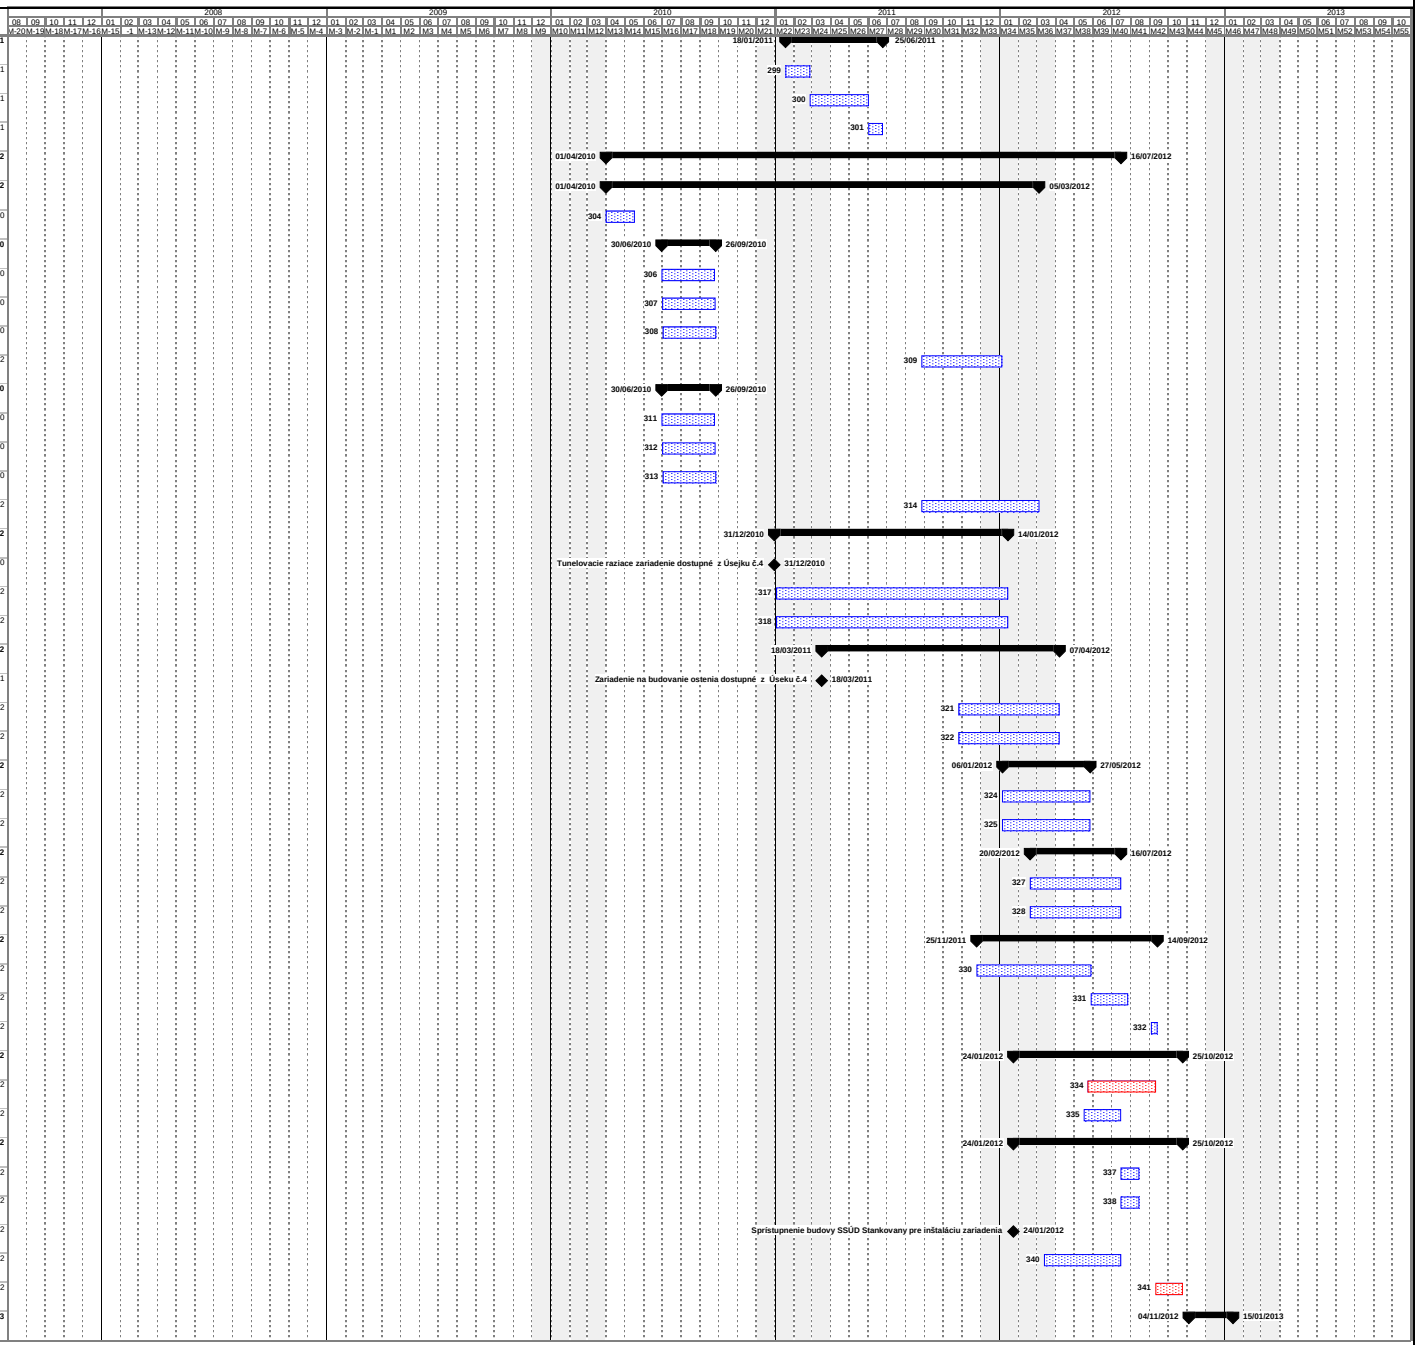
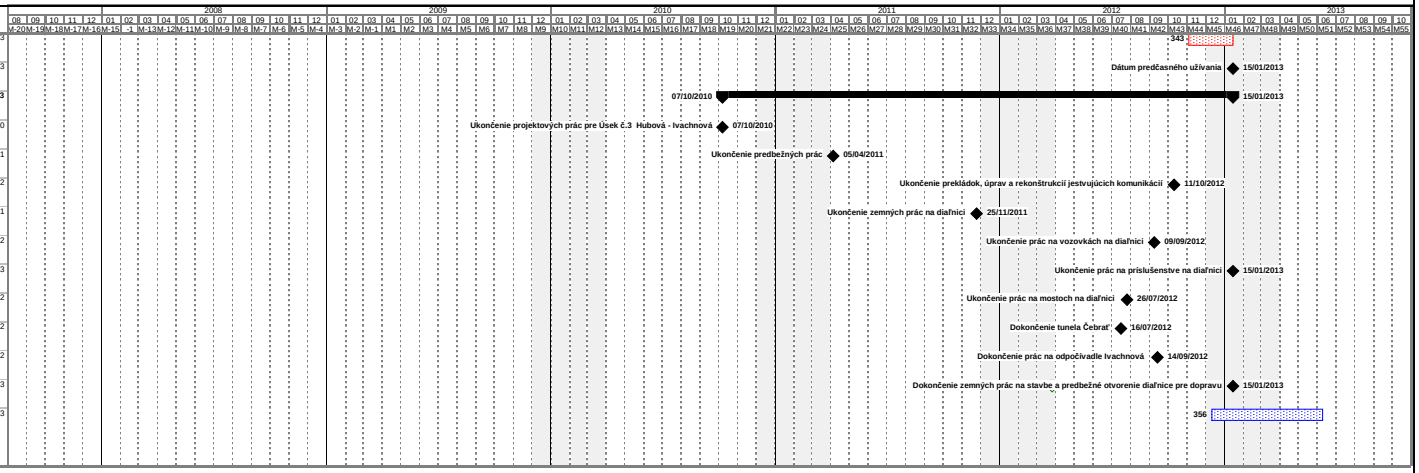
Nº	Task	Duration	Start	Finish
343	Preberacie konania a skúšobná prevádzka	60 j	04/11/12	15/01/13
344	Dátum predčasného užívania	0 j	15/01/13	15/01/13
345	**Tabuľka míľnikov**	**592,8 j**	**07/10/10**	**15/01/13**
346	Ukončenie projektových prác pre Úsek č.3 Hubová - Ivachnová	0 j	07/10/10	07/10/10
347	Ukončenie predbežných prác	0 j	05/04/11	05/04/11
348	Ukončenie prekládok, úprav a rekonštrukcií jestvujúcich komunikácií	0 j	11/10/12	11/10/12
349	Ukončenie zemných prác na diaľnici	0 j	25/11/11	25/11/11
350	Ukončenie prác na vozovkách na diaľnici	0 j	09/09/12	09/09/12
351	Ukončenie prác na príslušenstve na diaľnici	0 j	15/01/13	15/01/13
352	Ukončenie prác na mostoch na diaľnici	0 j	26/07/12	26/07/12
353	Dokončenie tunela Čebrať	0 j	16/07/12	16/07/12
354	Dokončenie prác na odpočívadle Ivachnová	0 j	14/09/12	14/09/12
355	Dokončenie zemných prác na stavbe a predbežné otvorenie diaľnice pre dopravu	0 j	15/01/13	15/01/13
356	**Nedokončené práce + vydanie osvedčenia o skutočnom ukončení stavby a kolaudačného schválenia**	129 j	11/12/12	10/06/13
