Úsek 1 - DUBNÁ SKALA - TURANY

N°	Úloha	Doba trvania
1	**Hlavné termíny**	**1478,88 j**
2	Výber úspešného uchádzača	0 j
3	Podpis Koncesnej zmluvy	0 j
4	Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy	0 j
5	Vydanie Stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom podľa súťažnej dokumentácie	0 j
6	Právo vstupu na Stavenisko	0 j
7	Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie	0 j
8	Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia	0 j
9	**Projektová dokumentácia**	**352 j**
10	**Prípravné práce**	**149 j**
11	Zostavenie tímu projektanta (z iného Úseku)	200 j
12	Zahájenie projektových prác	0 j
13	Zariadenia staveniska - stavebné dvory	30 j
14	Búracie práce + prístupové cesty (projekty & povolenia) SO 001+ 036 až 057 + 121 až 304+ 801 až 812	30 j
15	Dočasné mosty (projektová dokumentácia & povolenia)	30 j
16	Dočasné elektrické vedenia	30 j
17	**Úsek č.1 Preložky sietí a vedení (elektrické, telekomunikačné, plynovody a i.)**	**36 j**
18	**Úpravy a preložky zariadení ŽSR SO 401 +402 & 656 až 690**	**13 j**
51	**Preložky elektrických vedení SO 601 až 653**	**30 j**
97	**Preložky plynovodov SO 701 až 705**	**30 j**
103	**Preložky telekomunikačných káblov SO 751 až 770**	**30 j**
124	**Úsek č.1 Regulácia vodných tokov, vodovody a kanalizácie**	**60 j**
125	**Kanalizácie a vodovody SO 124 až 138**	**30 j**
141	**Úpravy vodných tokov SO 581 až 591**	**30 j**
151	**Súbory objektov kritických mostov**	**225 j**
152	**Zakladanie kritických mostov**	**145 j**
153	Výkresová dokumentácia základov Úsek č.1(SO 201, 205, 206)	70 j
154	Výkresová dokumentácia základov Úsek č.1(SO 219, 228)	60 j
155	Schválenie projektov základania kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 201, 205, 206)	30 j
156	**Súbory projektov pilierov kritických mostov**	**155 j**
157	Projektová dokumentácia pilierov mostov Úseku č.1 (SO 201, 205, 206)	70 j
158	Projektová dokumentácia pilierov mostov Úseku č.1 (SO 219, 228)	50 j
159	Schválenie projektov pilierov kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (201, 205, 206)	30 j
160	Schválenie projektov pilierov kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (219, 228)	30 j
161	**Sady mostoviek kritických mostov**	**160 j**
162	Projektová dokumentácia mostoviek Úseku č.1 (SO 201, 205, 206)	70 j
163	Schválenie projektov mostoviek kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 201, 205, 206)	30 j
164	Projektová dokumentácia mostoviek Úseku č.1 (SO 219, 228)	90 j
165	Schválenie projektov mostoviek kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 219, 228)	30 j
166	**Ďalšie súbory objektov (2 súbory /týždeň)**	**171 j**
167	**Úsek č.1 Ďalšie súbory zakladania a pilierov**	**100 j**

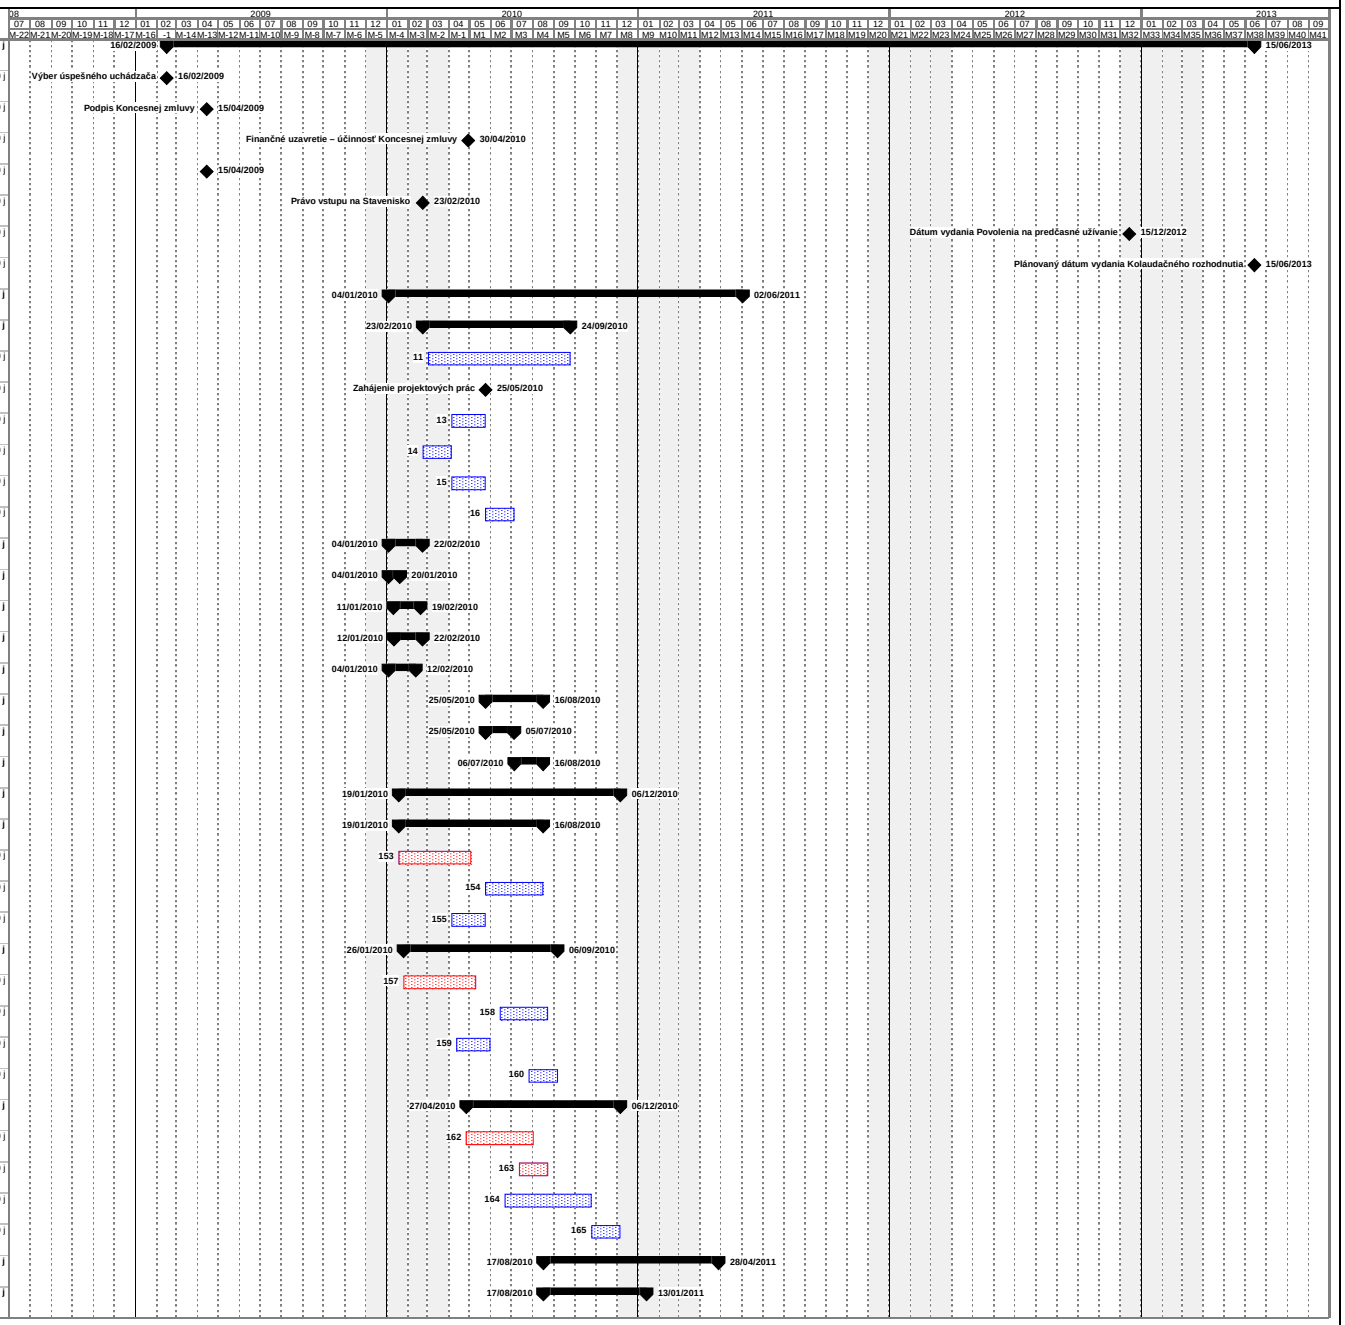

N°	Úloha	Doba trvania
168	Úsek č.1 (SO 227, 212)	60 j
169	Úsek č.1 (SO 208, 210, 220)	80 j
170	Úsek č.1 (SO 202, 203, 204)	80 j
171	Úsek č.1 (SO 207, 208, 209)	80 j
172	Úsek č.1 (SO 224, 225, 226)	80 j
173	Úsek č.1 (SO 215, 216, 217)	80 j
174	Úsek č.1 (SO 218, 221, 222)	80 j
175	Úsek č.1 (SO 223, 211, 213, 214)	80 j
176	Úsek č.1 (SO 801-21, 801-22, 809-21)	80 j
177	**Úsek č.1 Ďalšie súbory mostoviek (2 súbory /týždeň)**	**120 j**
178	Úsek č.1 (SO 227, 212)	50 j
179	Úsek č.1 (SO 208, 210, 220)	80 j
180	Úsek č.1 (SO 202, 203, 204)	80 j
181	Úsek č.1 (SO 207, 208, 209)	80 j
182	Úsek č.1 (SO 224, 225, 226)	80 j
183	Úsek č.1 (SO 215, 216, 217)	80 j
184	Úsek č.1 (SO 218, 221, 222)	80 j
185	Úsek č.1 (SO 223, 211,213, 214)	80 j
186	Úsek č.1 (SO 801-21, 801-22, 809-21)	50 j
187	**Steny a múry - oporné, zárubné múry a protihlukové steny**	**90 j**
188	**Úsek č.1 Steny a múry - oporné, zárubné múry a protihlukové steny**	**90 j**
189	**Oporné múry SO 231 až 244**	**90 j**
190	231-00 Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	30 j
191	232-00 Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	30 j
192	235-00 Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	30 j
193	236-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	30 j
194	237-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	30 j
195	238-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	30 j
196	239-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	30 j
197	240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	30 j
198	243-00 Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	30 j
199	244-00 Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	30 j
200	**Protihlukové steny / Noise protection measure 251 to 262**	**22 j**
201	251-to 262 Protihluková stena	30 j
202	**Projekty elektrických Preložok a prípojok**	**96 j**
203	Dopravný informačný systém & kontrola & platby	36 j
204	Elektrické prípojky & uzemňovací systém	20 j
205	Telekomunikačné káble	20 j
206	Osvetlenie	20 j
207	**Odpočívadlo**	**160 j**
208	**Odpočívadlo / Zariadenia/areály na diaľnici**	**100 j**

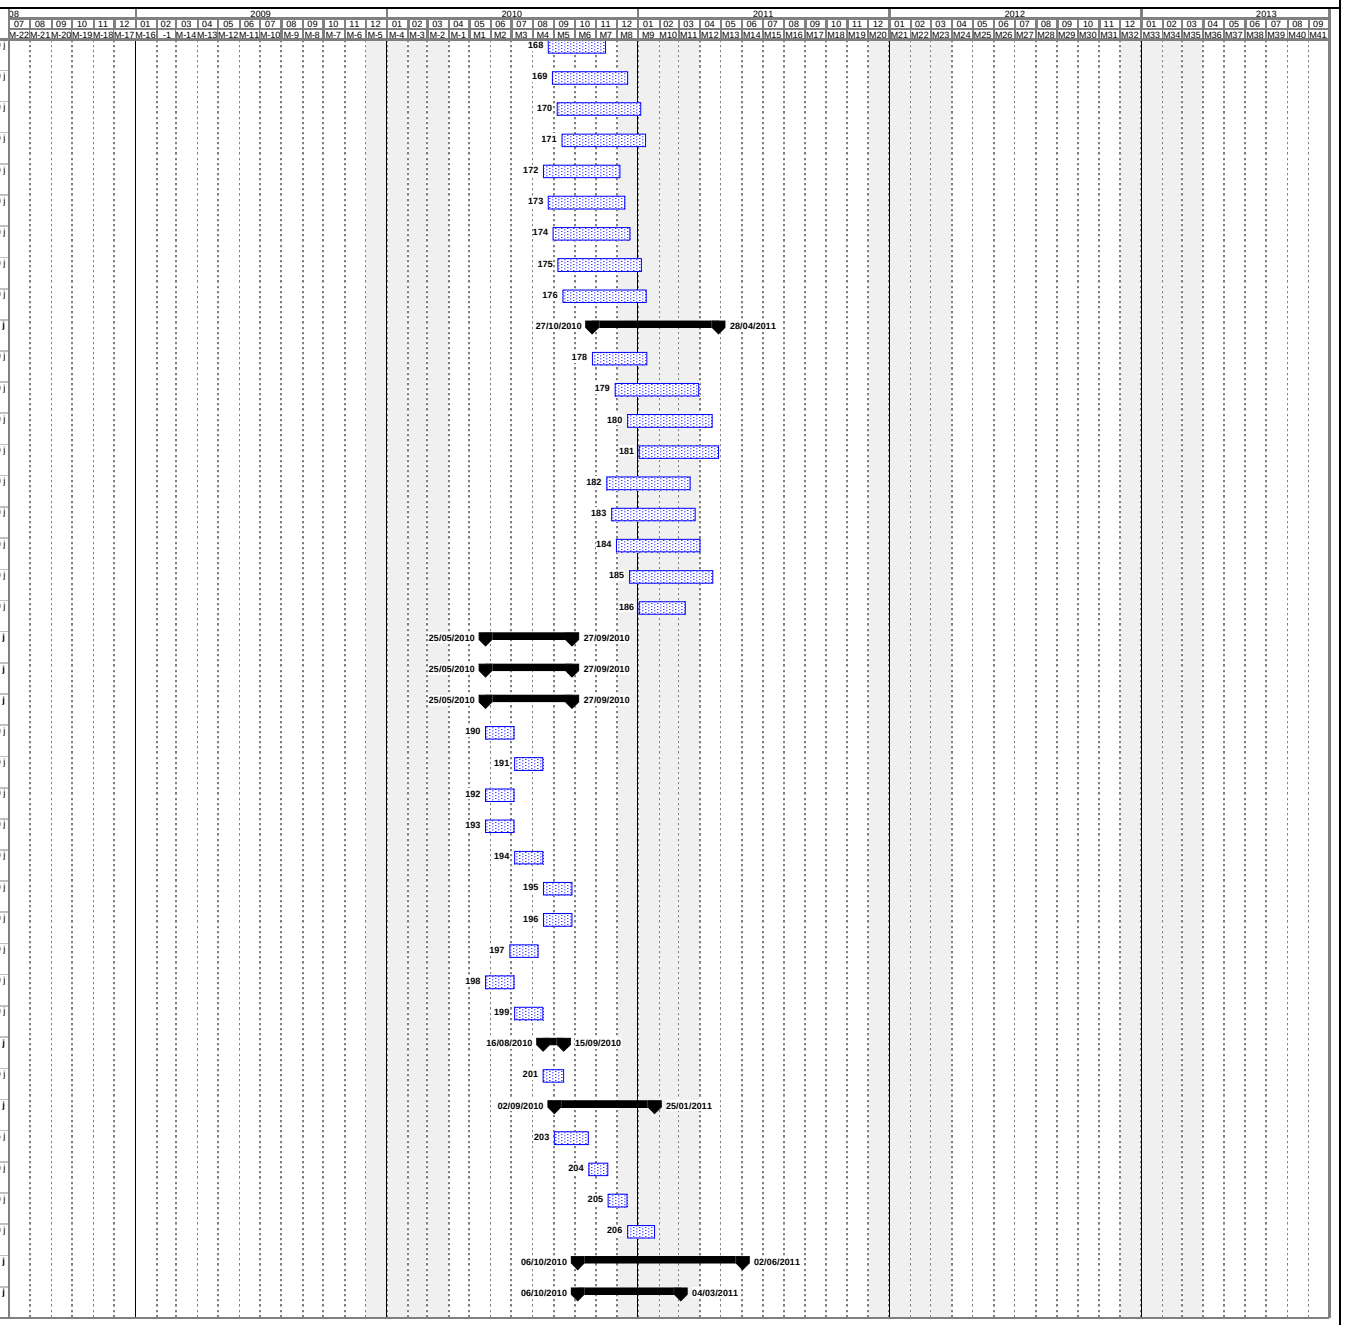

N°	Úloha	Doba trvania
209	**Úsek č.1 Odpočívadlo**	100 j
210	Malé odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	100 j
211	**Čerpacie stanice**	60 j
212	**Úsek č.1 Čerpacie stanice**	60 j
213	SO 562-00 Čerpacia stanica pre ORL 562, 563, 564, 565, 566, 568	60 j
214	**Diaľnica (zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, vozovky, oplotenie)**	123 j
215	**Úsek č.1 Diaľnica (zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, vozovky, oplotenie)**	123 j
216	101-00 Diaľnica D1	58 j
217	102-00 Križovatka Dubná skala	13 j
218	103-00 Križovatka Martin 1	13 j
219	104-00 Križovatka Turany	13 j
220	111-00 Privádzač Martin	13 j
221	112-00 Križovatka Martin 2	13 j
222	**Kanalizácia diaľnice SO 501**	28 j
223	S1 501-00 Kanalizácia diaľnice D1	28 j
224	**Oplotenie diaľnice D1 SO 301**	30 j
225	S1 301-00 Oplotenie diaľnice D1	30 j
226	**Zvislé dopravné značky, vodorovné značenie, osvetlenie diaľnice**	30 j
227	**Úsek č.1 Zvislé a vodorovné značky, osvetlenie**	30 j
228	Dopravné značenie	30 j
229	**Verejné obstarávanie**	300 j
230	**Diaľničná technológia**	300 j
231	**Cesty / komunikácie**	300 j
232	Mechanické a elektrické vybavenie a zariadenia (FOB, CCTV, ECB, TLE)	300 j
233	**Výstavba**	944 j
234	**Výstavba**	944 j
235	**Prípravné práce**	224,88 j
236	Výrub stromov pre stavebné práce v roku 2009	50 j
237	Archeologický výskum	168 j
238	Zabezpečenie laboratórií	45 j
239	Prístupové cesty & povolenia	120 j
240	Zábery pozemkov	60 j
241	Dočasné mosty	60 j
242	Zariadenia staveniska - stavebné dvory	90 j
243	Dočasné elektrické vedenia	30 j
244	Začiatok stavebných prác	0 j
245	**Mosty**	799 j
246	**Mostný objekt SO 201**	799 j
247	Špeciálne zakladanie	58 j
248	Spodná stavba	227 j
249	Horná stavba	520 j

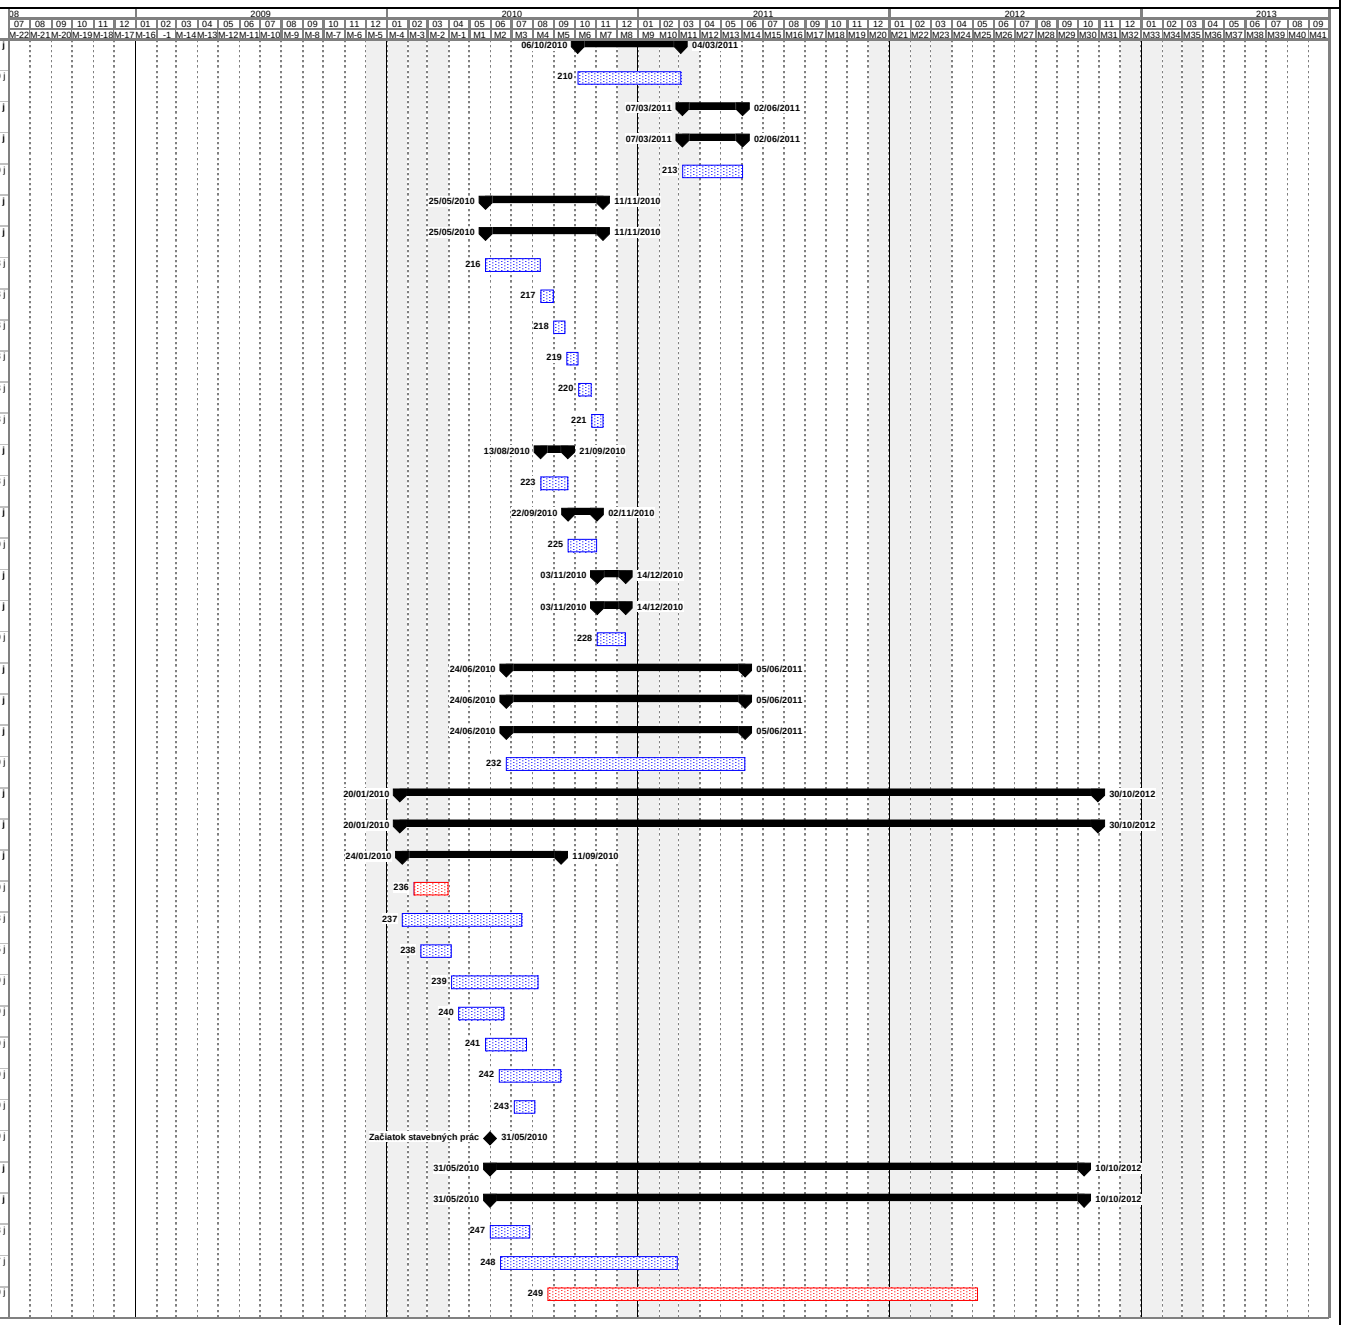

N°	Úloha	Doba trvania
250	Izolácie proti vode	80 j
251	Dokončovacie práce & vozovky	150 j
252	**Mostný objekt SO 202**	**130 j**
253	Spodná stavba	43 j
254	Horná stavba	42 j
255	Izolácie proti vode	18 j
256	Dokončovacie práce & vozovky	66 j
257	**Mostný objekt SO 203**	**117 j**
258	Spodná stavba	39 j
259	Horná stavba	35 j
260	Izolácie proti vode	15 j
261	Dokončovacie práce & vozovky	57 j
262	**Mostný objekt SO 204**	**111 j**
263	Spodná stavba	35 j
264	Horná stavba	31 j
265	Izolácie proti vode	9 j
266	Dokončovacie práce & vozovky	49 j
267	**Mostný objekt SO 205**	**437 j**
268	Špeciálne zakladanie	118 j
269	Spodná stavba	143 j
270	Horná stavba	240 j
271	Izolácie proti vode	49 j
272	Dokončovacie práce & vozovky	112 j
273	**Mostný objekt SO 206**	**249,13 j**
274	Špeciálne zakladanie	70 j
275	Spodná stavba	100 j
276	Horná stavba	140 j
277	Izolácie proti vode	49 j
278	Dokončovacie práce & vozovky	112 j
279	**Mostný objekt SO 207**	**284 j**
280	Špeciálne zakladanie	45 j
281	Spodná stavba	94 j
282	Horná stavba	172 j
283	Izolácie proti vode	16 j
284	Dokončovacie práce & vozovky	63 j
285	**Mostný objekt SO 208**	**334 j**
286	Špeciálne zakladanie	63 j
287	Spodná stavba	108 j
288	Horná stavba	82 j
289	Izolácie proti vode	18 j
290	Dokončovacie práce & vozovky	119 j

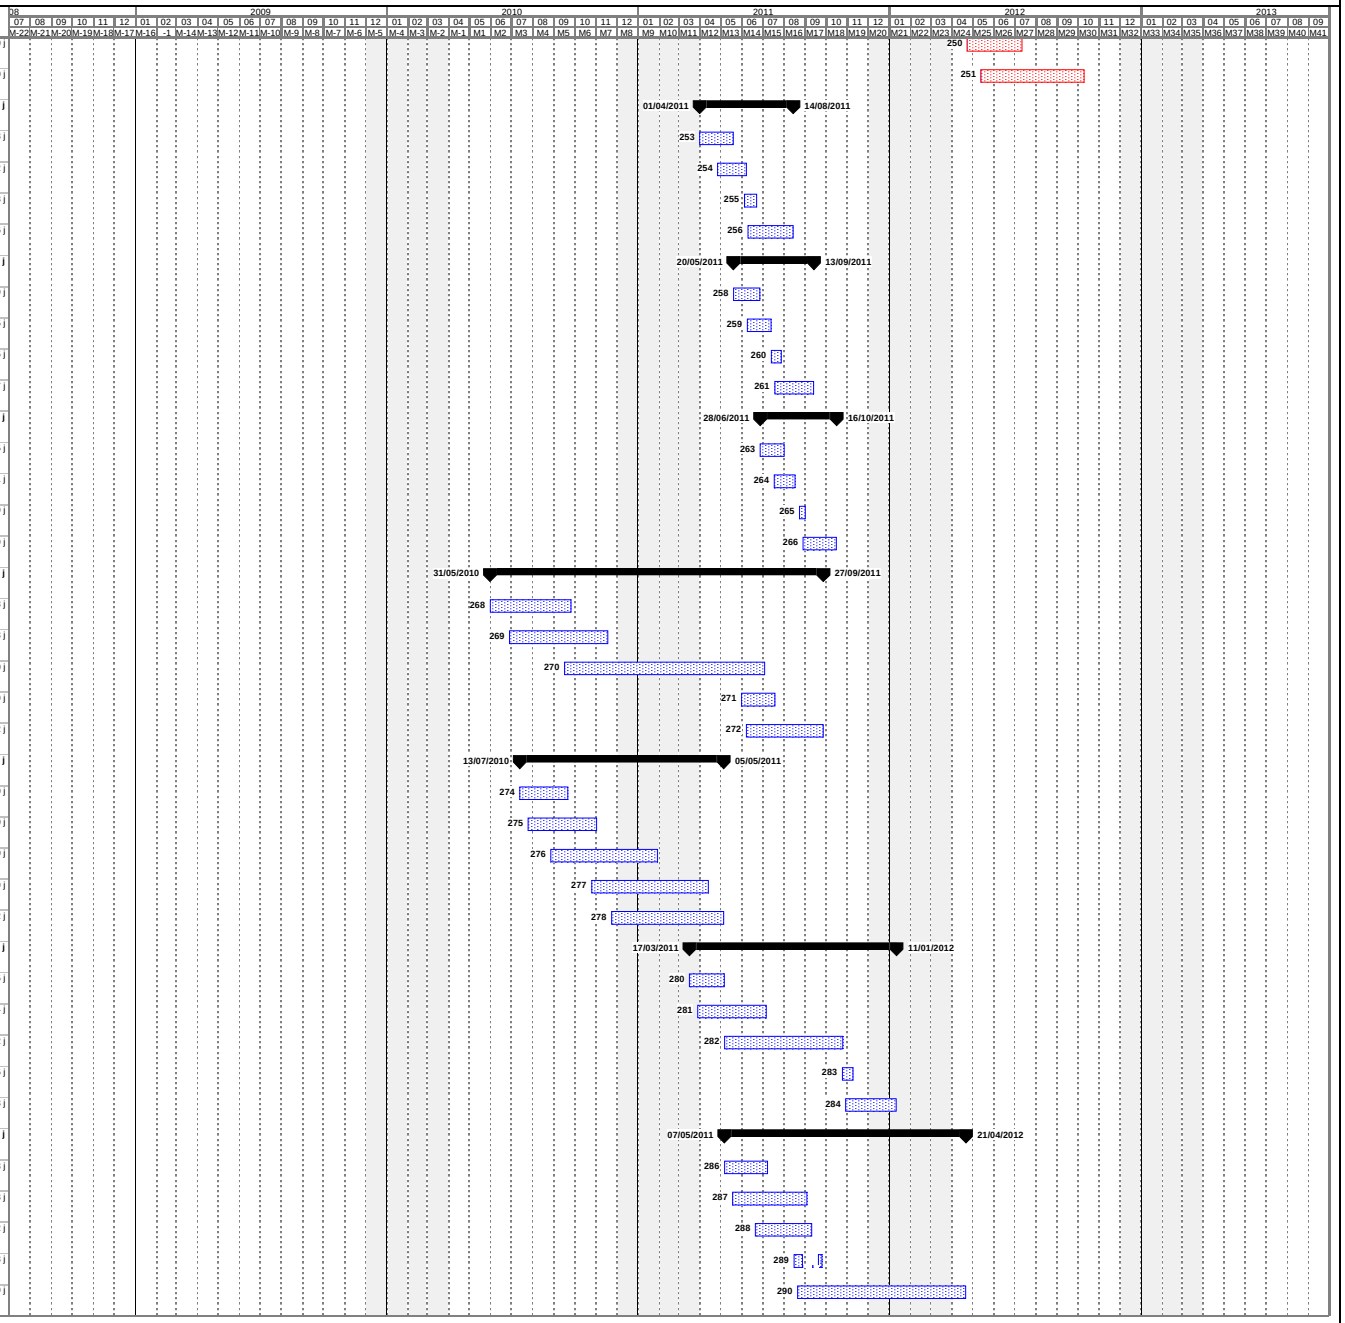

N°	Úloha	Doba trvania
291	**Mostný objekt SO 209**	**345,13 j**
292	Špeciálne zakladanie	21 j
293	Spodná stavba	63 j
294	Horná stavba	145 j
295	Izolácie proti vode	20 j
296	Dokončovacie práce & vozovky	78 j
297	**Mostný objekt SO 210**	**387 j**
298	Špeciálne zakladanie	76 j
299	Spodná stavba	98 j
300	Horná stavba	150 j
301	Izolácie proti vode	12 j
302	Dokončovacie práce & vozovky	78 j
303	**Mostný objekt SO 211**	**126 j**
304	Spodná stavba	35 j
305	Horná stavba	31 j
306	Izolácie proti vode	9 j
307	Dokončovacie práce & vozovky	49 j
308	**Mostný objekt SO 212**	**198 j**
309	Spodná stavba	64 j
310	Horná stavba	98 j
311	Izolácie proti vode	15 j
312	Dokončovacie práce & vozovky	65 j
313	**Mostný objekt SO 213**	**132 j**
314	Spodná stavba	37 j
315	Horná stavba	34 j
316	Izolácie proti vode	13 j
317	Dokončovacie práce & vozovky	56 j
318	**Mostný objekt SO 214**	**93 j**
319	Spodná stavba	33 j
320	Horná stavba	29 j
321	Izolácie proti vode	8 j
322	Dokončovacie práce & vozovky	38 j
323	**Mostný objekt SO 215**	**122 j**
324	Spodná stavba	72 j
325	Horná stavba	102 j
326	Izolácie proti vode	17 j
327	Dokončovacie práce & vozovky	68 j
328	**Mostný objekt SO 216**	**176 j**
329	Špeciálne zakladanie	8 j
330	Spodná stavba	48 j
331	Horná stavba	67 j

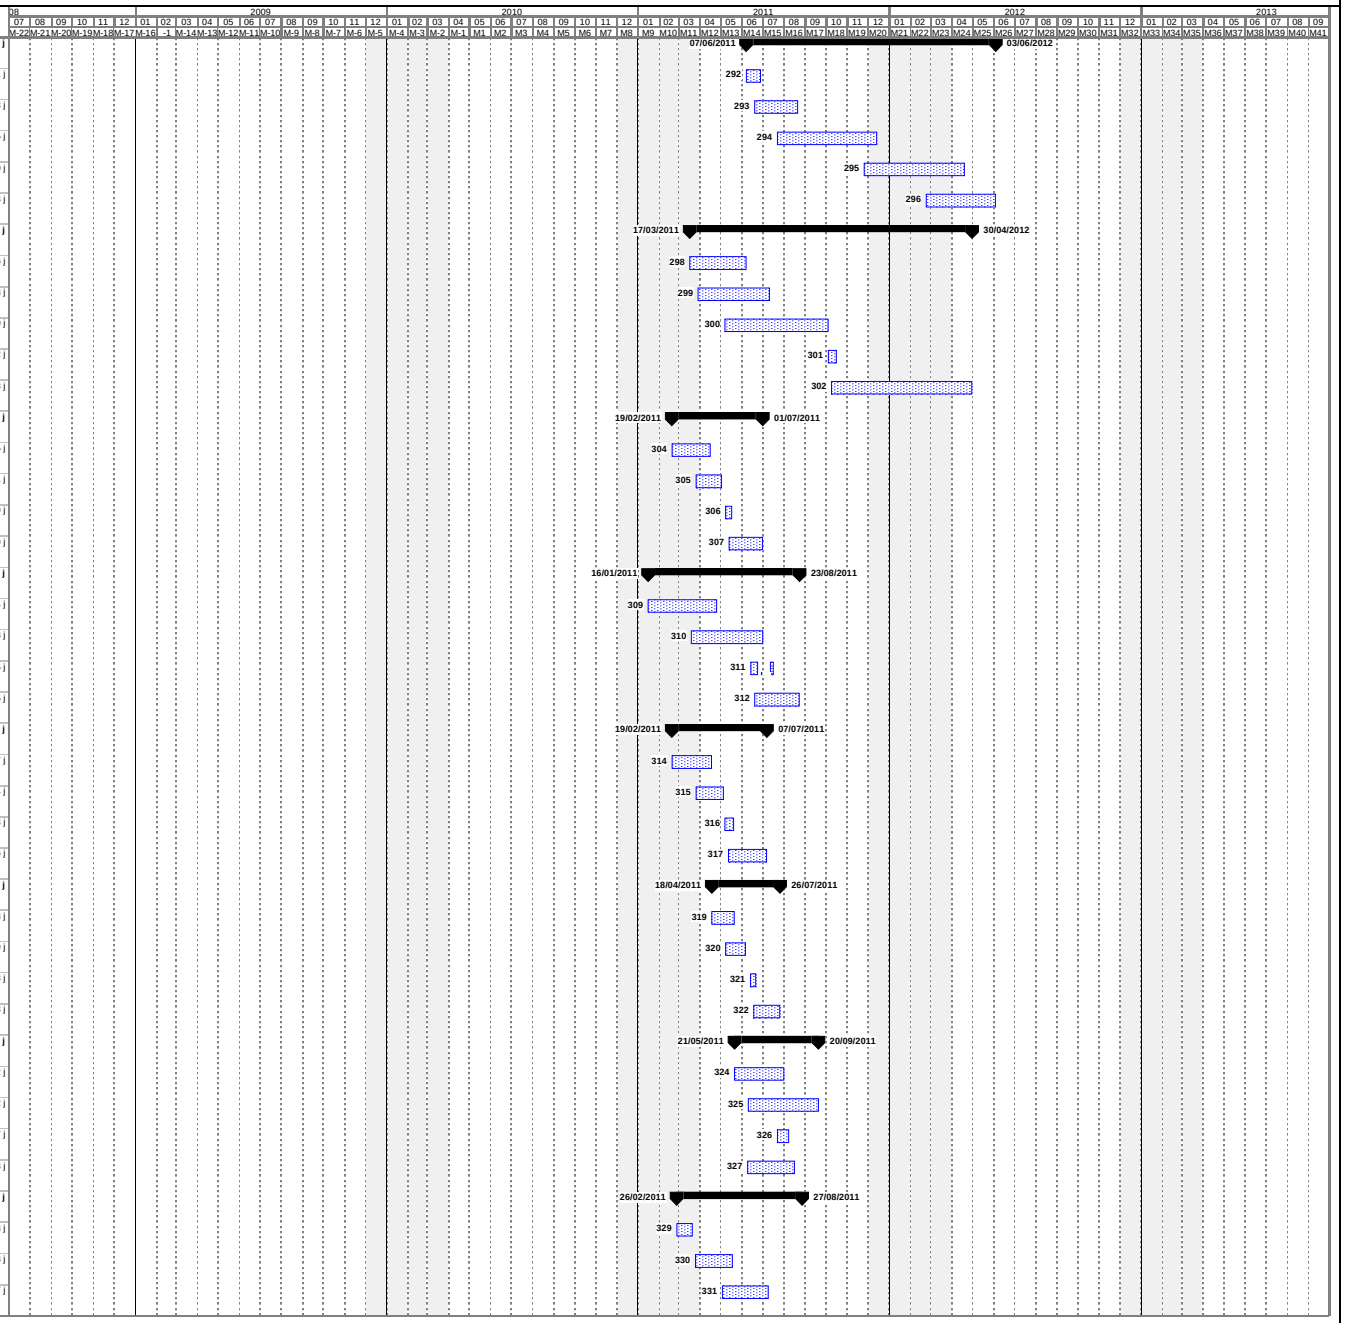

N°	Úloha	Doba trvania
332	Izolácie proti vode	5 j
333	Dokončovacie práce & vozovky	44 j
334	**Mostný objekt SO 217**	**117 j**
335	Spodná stavba	37 j
336	Horná stavba	34 j
337	Izolácie proti vode	7 j
338	Dokončovacie práce & vozovky	35 j
339	**Mostný objekt SO 218**	**260 j**
340	Špeciálne zakladanie	10 j
341	Spodná stavba	51 j
342	Horná stavba	138 j
343	Izolácie proti vode	12 j
344	Dokončovacie práce & vozovky	72 j
345	**Mostný objekt SO 219**	**345 j**
346	Špeciálne zakladanie	92 j
347	Spodná stavba	150 j
348	Horná stavba	220 j
349	Izolácie proti vode	45 j
350	Dokončovacie práce & vozovky	145 j
351	**Mostný objekt SO 220**	**332 j**
352	Špeciálne zakladanie	76 j
353	Spodná stavba	98 j
354	Horná stavba	187 j
355	Izolácie proti vode	29 j
356	Dokončovacie práce & vozovky	127 j
357	**Mostný objekt SO 221**	**118 j**
358	Špeciálne zakladanie	7 j
359	Spodná stavba	35 j
360	Horná stavba	31 j
361	Izolácie proti vode	9 j
362	Dokončovacie práce & vozovky	49 j
363	**Mostný objekt SO 222**	**119 j**
364	Spodná stavba	42 j
365	Horná stavba	38 j
366	Izolácie proti vode	11 j
367	Dokončovacie práce & vozovky	52 j
368	**Mostný objekt SO 223**	**176 j**
369	Spodná stavba	42 j
370	Horná stavba	54 j
371	Izolácie proti vode	17 j
372	Dokončovacie práce & vozovky	78 j

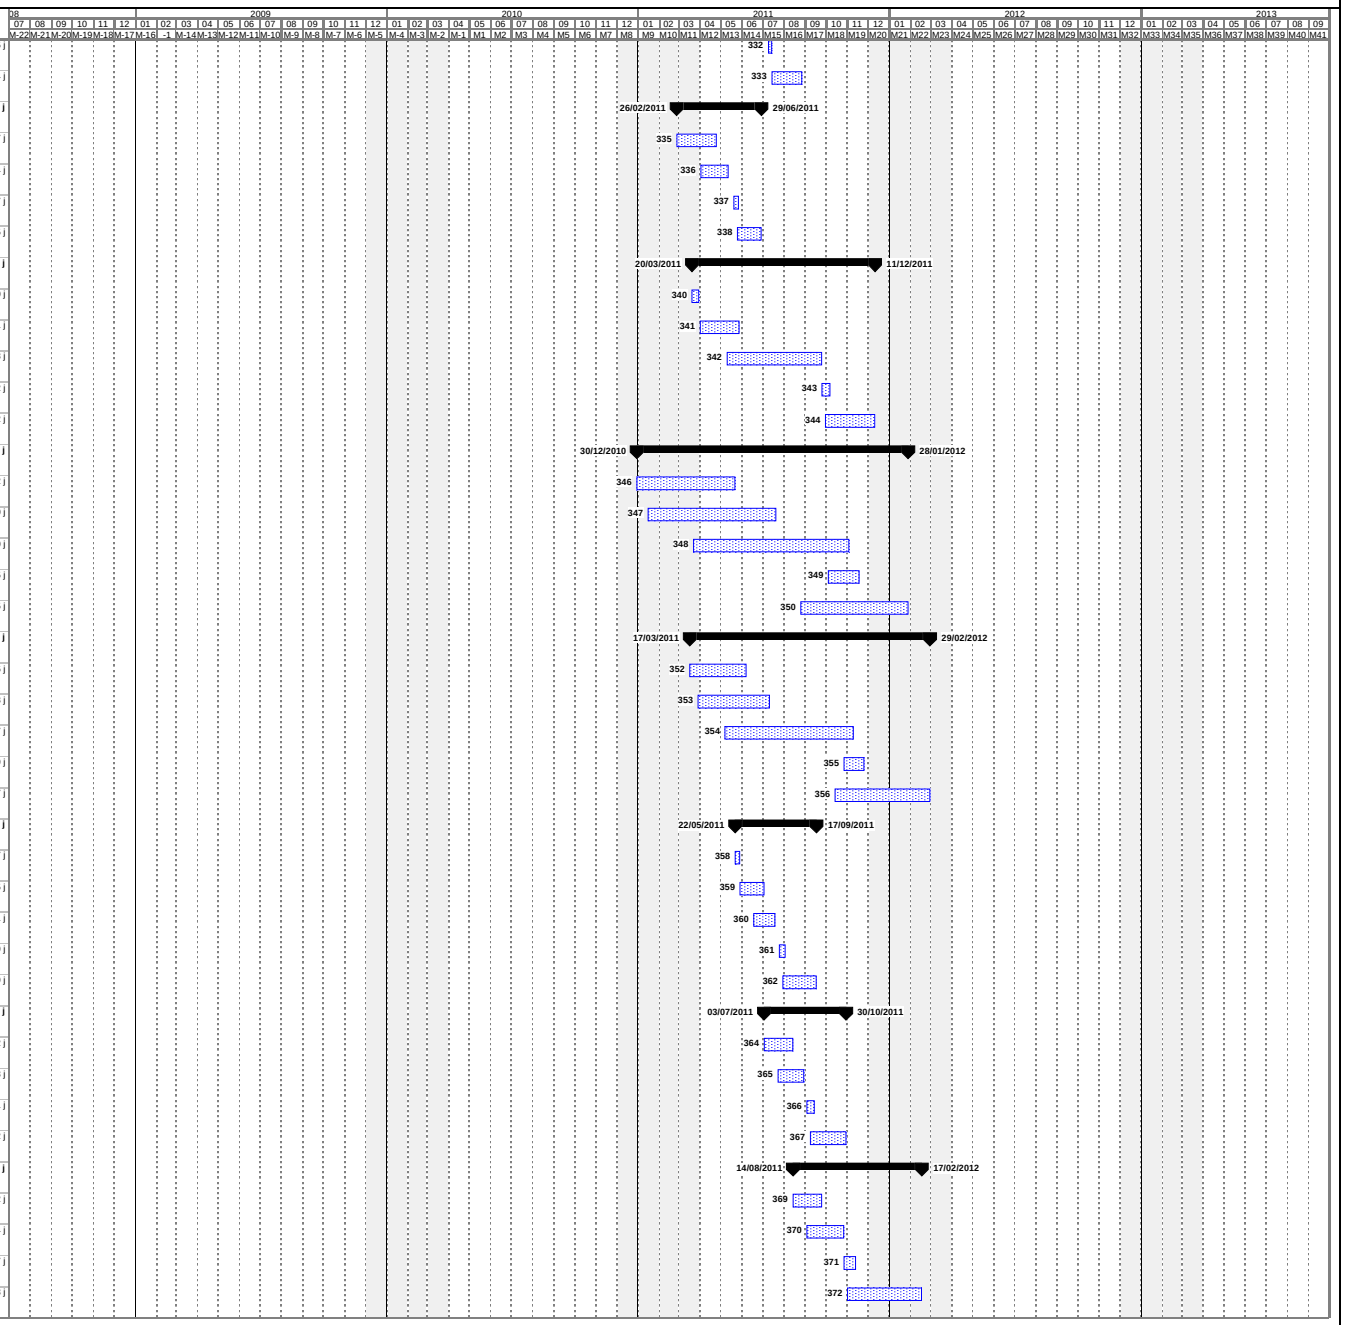

N°	Úloha	Doba trvania
373	**Mostný objekt SO 224**	**576,88 j**
374	Špeciálne zakladanie	86 j
375	Spodná stavba	142 j
376	Horná stavba	375 j
377	Izolácie proti vode	45 j
378	Dokončovacie práce & vozovky	138 j
379	**Mostný objekt SO 225**	**589,88 j**
380	Špeciálne zakladanie	132 j
381	Spodná stavba	192 j
382	Horná stavba	400 j
383	Izolácie proti vode	47 j
384	Dokončovacie práce & vozovky	175 j
385	**Mostný objekt SO 226**	**156 j**
386	Spodná stavba	84 j
387	Horná stavba	76 j
388	Izolácie proti vode	32 j
389	Dokončovacie práce & vozovky	114 j
390	**Mostný objekt SO 227**	**439 j**
391	Špeciálne zakladanie	132 j
392	Spodná stavba	144 j
393	Horná stavba	250 j
394	Izolácie proti vode	33 j
395	Dokončovacie práce & vozovky	175 j
396	**Mostný objekt SO 228**	**201,13 j**
397	Spodná stavba	53 j
398	Horná stavba	65 j
399	Izolácie proti vode	23 j
400	Dokončovacie práce & vozovky	78 j
401	**Zemné práce (na hlavnom objekte, ďalšie sú v iných objektoch ciest)**	**408 j**
402	**Diaľnica SO 101, 111**	**300 j**
403	Zemné práce 01: 0,850 až 7,700 km	200 j
404	Zemné práce 02: 8,00 až 16,400 km	200 j
405	Zemné práce 03: zemné práce 2.etapa	130 j
406	Cesty SO 121 až 171	210 j
407	Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103, 104 a SO 112	230 j
408	**Oporné múry**	**296 j**
409	Oporný múr SO 231	48 j
410	Oporný múr SO 232	184 j
411	Oporný múr SO 235	200 j
412	Oporný múr SO 236	116 j
413	Oporný múr SO 237	116 j

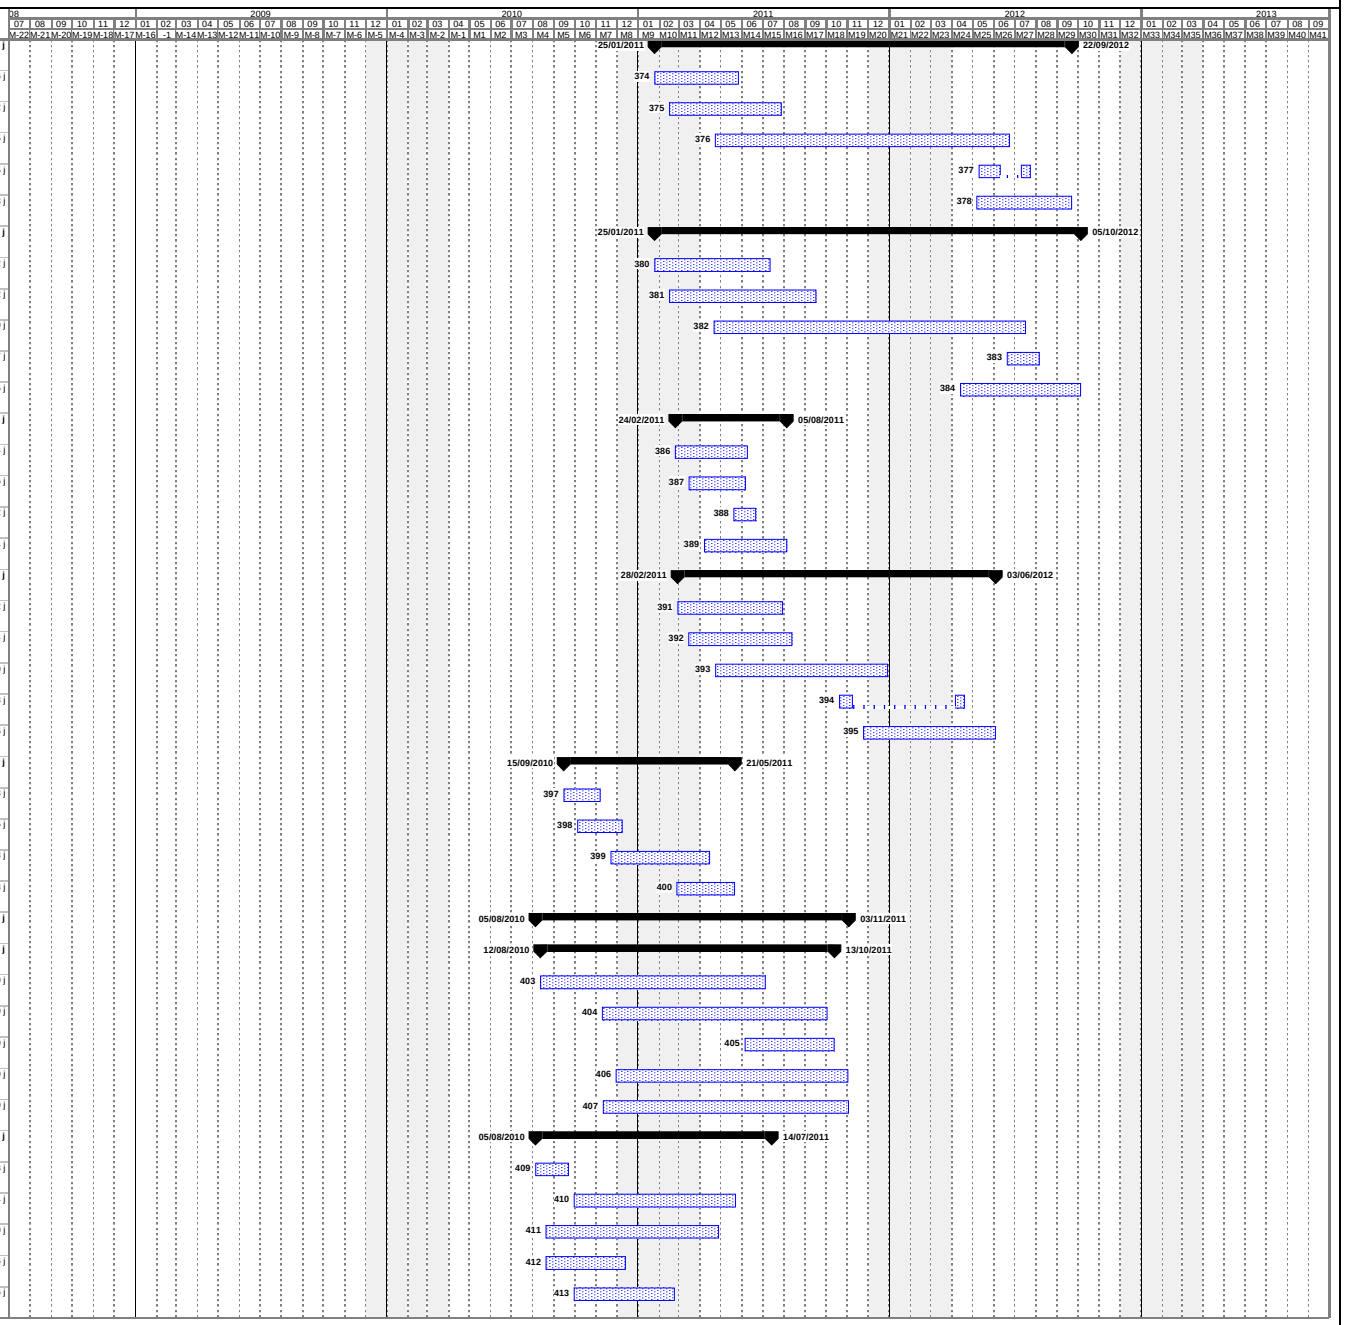

N°	Úloha	Doba trvania
414	Oporný múr SO 238	52 j
415	Oporný múr SO 239	107 j
416	Oporný múr SO 240	64 j
417	Oporný múr SO 243	180 j
418	Oporný múr SO 244	86 j
419	Ukončenie výstavby oporných múrov	0 j
420	**Odvodnenie**	**345 j**
421	Ryhy pre uloženie drenáže SO 501 až 509	300 j
422	Bočné odvodnenie SO 501 až 509	300 j
423	Potrubia SO 501 až 509 & SO 562 až 568	300 j
424	Výpustný objekt SO 562 až 568	280 j
425	Regulácia prípojky SO 562 až 568 + SO 562-11 až 568-11	100 j
426	**Ďalšie práce**	**717 j**
427	Prekládka VN el. vedenia SO 601 až 633	180 j
428	Prekládka NN el. vedenia SO 636 až 653	79 j
429	Prekládka telekomunikačných káblovm SO 751 až 759	143 j
430	Prekládka optických káblov SO 760 až 770	195 j
431	Prekládka potokov & úprava vodných diel SO 581 až 591	270 j
432	Prekládka vodovodov SO 520 až 540	163 j
433	Prekládka plynovodov SO 701 až 705	150 j
434	Úprava fasád a priečelí budov SO 217 až 274	28 j
435	Obnova jestvujúcich železničných tratí SO 331, 401, 402, 686 až 690	76 j
436	Prekládka dočasného trakčného vedenia SO 656 až 683 + SO 686-11 až 690-11	218 j
437	Kanalizácia	304 j
438	Oplotenie SO 301 až SO 304	200 j
439	**Vozovky**	**406,88 j**
440	Diaľnica SO 101 až 111	200 j
441	Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103, 104 a 112	53 j
442	**Iné cesty**	**338 j**
443	Prekládky ciest / obchádzky SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71	338 j
444	Prekládka obslužných ciest Relocation of cart road SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71	338 j
445	Úprava hlavných ciest SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71	338 j
446	Búracie práce SO 001 až 036	153 j
447	**Protihlukové steny**	**329 j**
448	Protihluková stena SO 251	85 j
449	Protihluková stena SO 252	174 j
450	Protihluková stena SO 253	205 j
451	Protihluková stena SO 254	269 j
452	Protihluková stena SO 255	47 j
453	Protihluková stena SO256	205 j
454	Protihluková stena SO 257	56 j

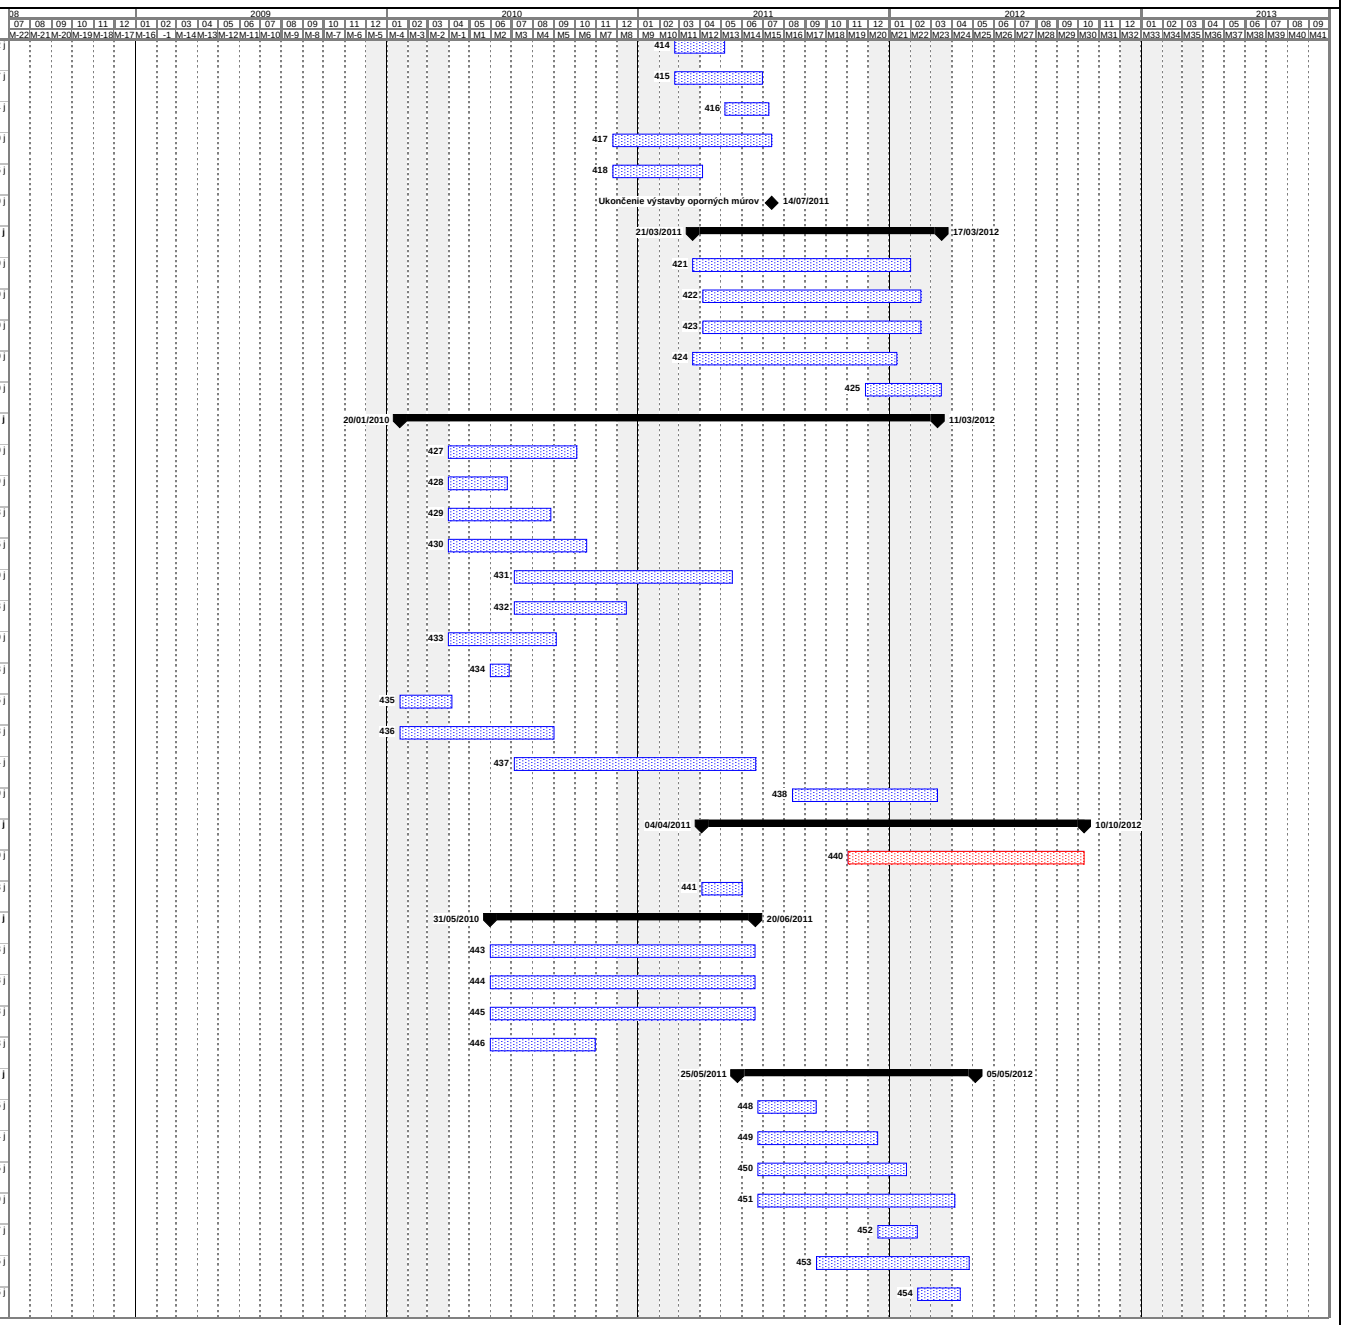
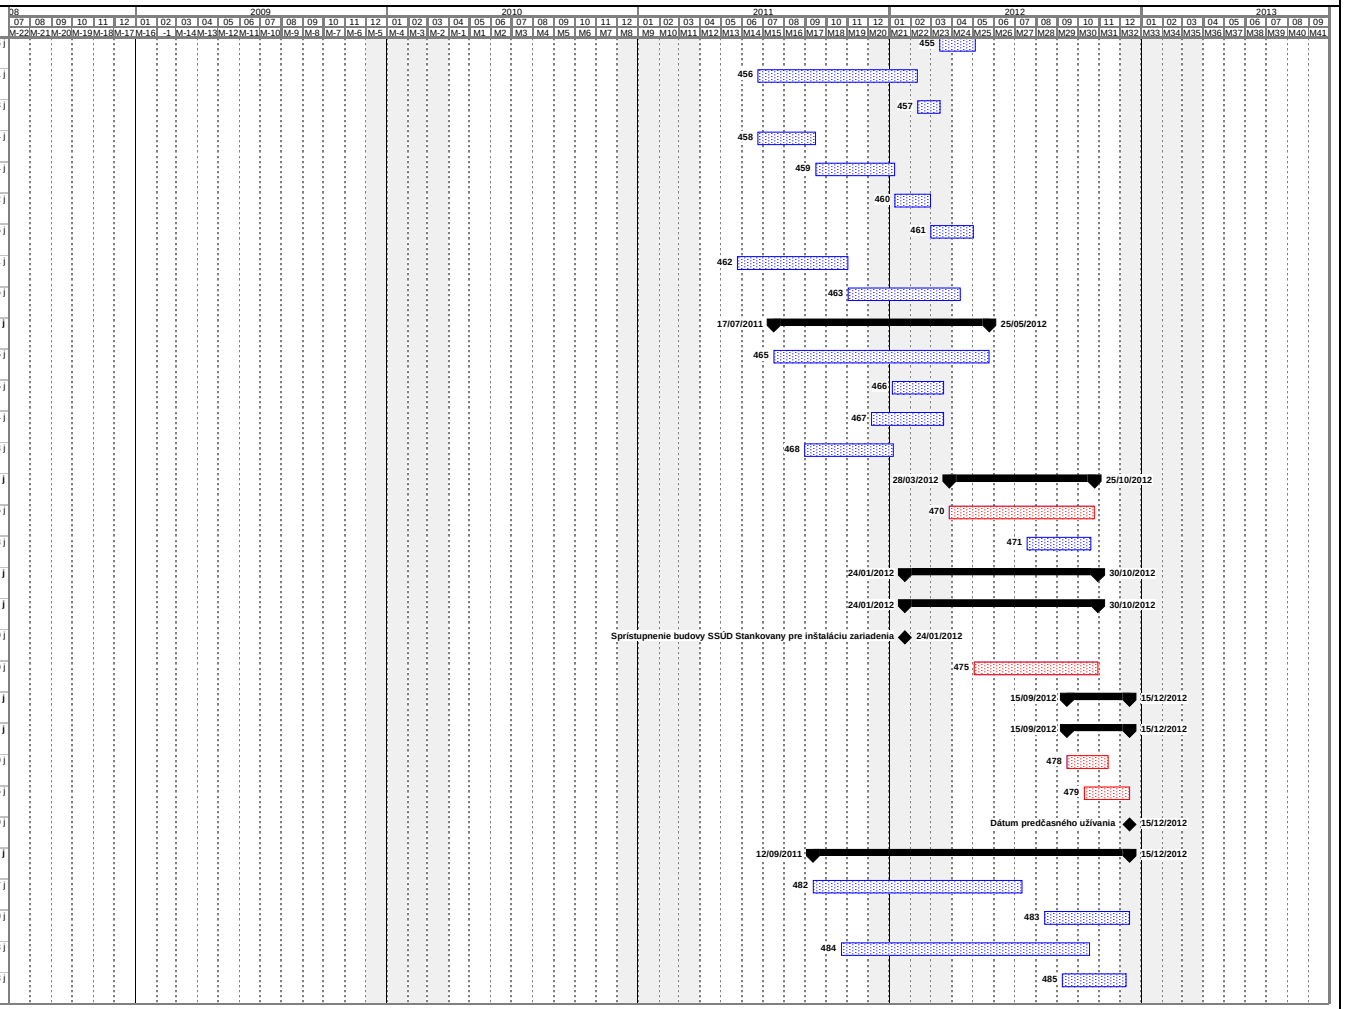
N°	Úloha	Doba trvania
455	Protihluková stena SO 258	46 j
456	Protihluková stena SO 259	221 j
457	Protihluková stena SO 260	33 j
458	Protihluková stena SO 261	84 j
459	Protihluková stena SO 262	104 j
460	Protihluková stena SO 263	52 j
461	Protihluková stena SO 264	56 j
462	Protihluková stena SO 265	161 j
463	Protihluková stena SO 266	146 j
464	**Obslužné plochy**	**296 j**
465	Odpočívadlá - malá architektúra SO 310 až 320	296 j
466	Odpočívadlá - elektrické prípojky	75 j
467	Odpočívadlá - vodovodné prípojky	94 j
468	Odpočívadlá - kanalizačné prípojky & prípojky dažďovej vody	118 j
469	**Dopravné značenie**	**205 j**
470	Informačný systém diaľnice SO 791 + SO 791-11	205 j
471	Dopravné značky SO 101 až 111	93 j
472	**Diaľničná technológia**	**274,88 j**
473	**Inštalácia zariadenia**	**274,88 j**
474	Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariadenia	0 j
475	Príslušenstvo diaľnice	180 j
476	**Skúšobná prevádzka a preberacie konania**	**91 j**
477	**Skúšobná prevádzka a preberacie konania**	**91 j**
478	Skúšobná prevádzka + Školenie pracovníkov prevádzky a údržby diaľnice	60 j
479	Skúšobná prevádzka a preberacie konania	66 j
480	Dátum predčasného užívania	0 j
481	**Vydanie Povolenia na predčasné užívanie**	**443 j**
482	Obnova plôch, výsadba a vegetačné úpravy SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71	287 j
483	Jestvujúce cesty / komunikácie (opravy + vozovka) SO 801 až 811	90 j
484	Cesty SO 121 až 171	218 j
485	Dopravné značky SO 121 až 171	93 j
