

Informácia o stave implementácie Programu Slovensko
k 31. 07. 2026

Obsah

1.	Základné informácie o Programe Slovensko.....	3
2.	Aktuálny stav implementácie P SK k 31. 07. 2026 a pokrok od 01. 01. 2026	4
3.	Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty.....	4
4.	Plnenie pravidla N+3.....	5
5.	Opatrenia na akceleráciu implementácie	5
5.1	Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov	6
5.2	Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK.....	6
5.3	Zrýchlenie procesov a zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania	7

1. Základné informácie o Programme Slovensko

Program Slovensko (ďalej len „P SK“) je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. P SK upravuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027.

Prostredníctvom P SK sa realizujú investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu + (ďalej len „ESF+“), Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) a Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“). P SK nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

V rámci P SK sa podarilo presadiť, že **2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR** (t. j. 19,16 %) je realizovaných cez **mechanizmus Integrovaných územných investícií** (ďalej len „IÚI“), ktoré reprezentujú pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania a prioritizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch Európskej únie. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú základnými predpokladmi

- a) územná dohoda o potrebe investície a
- b) pripravenosť projektov.

Riadiacim orgánom pre P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“). **Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky** (ďalej len „MF SR“). Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev, respektíve výber a implementácia projektov, poveril riadiaci orgán pre P SK **10 sprostredkovateľských orgánov**, ktorými sú:

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
4. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVM SR“),
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
8. Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“), a to za oblasť podpory rómskych komunít,
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), a to za oblasť výkonu kontroly verejného obstarávania,
10. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“).

Tabuľka č. 1 Rozdelenie alokácie v rámci P SK (v EUR)

Implementujúci subjekt	Alokácia
MD SR	3 382 120 791
MIRRI SR	2 435 055 747
MPSVR SR	1 808 615 613
MŽP SR	1 576 863 107
MŠVVM SR	1 021 277 277
SIEA	896 271 945
MH SR	572 825 210
ÚV SR	437 000 000
MZ SR	364 982 422
MV SR	98 722 821
Spolu Program Slovensko	12 593 734 933

Zdroj: Riadiaci orgán pre P SK - Alokácie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov platné od 22.07.2026 (podľa Finančného plánu v.5.0)

Investície z P SK smerujú do oblastí podpory/priorít v 5 cieľoch politiky súdržnosti Európskej únie a 1 samostatného špecifického cieľa:

- CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
- CP2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa
- CP3 – Prepojenejšia Európa
- CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
- CP5 – Európa bližšie k občanom
- Fond na spravodlivú transformáciu

2. Aktuálny stav implementácie P SK k 31. 07. 2026 a pokrok od 01. 01. 2026

Alokácia: 12,59 mld. EUR
 Vyhlásené výzvy: 385 v objeme 11,69 mld. EUR, t.j. 92,79 % alokácie
 Kontrahovanie: 8,70 mld. EUR, t.j. 69,09 % alokácie
 Čerpanie: 2,57 mld. EUR, t.j. 20,37 % alokácie
 Počet predložených žiadostí: 7 572, z ktorých bolo zatiaľ schválených 4 645.

Pokrok od 01. 01. 2026:

- **Nárast vo vyhlásených výzvach o 36 výziev vo výške 649,95 mil. EUR (z 87,6 % na 92,8 %)**
- **Nárast kontrahovania o 1,43 mld. EUR (z 57,7 % na 69,1 %)**
- **Nárast čerpania o 953,04 mil. EUR (z 12,8 % na 20,4 %)**

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu pre P SK sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola riadiacim orgánom pre P SK pridelená jednotlivým sprostredkovateľským orgánom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK.


Na implementácii P SK sa podieľa spolu 10 implementujúcich subjektov (sprostredkovateľských orgánov).

Tabuľka č. 2 Prehľad stavu implementácie P SK podľa jednotlivých implementujúcich subjektov k 31. 07. 2026

Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy		Kontrahovanie		Čerpanie	
		EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
MD SR	3 382 120 791	3 361 106 602	99,4%	2 658 939 048	78,6%	806 585 463	23,8%
MIRRI SR	2 435 055 747	2 120 756 672	87,1%	1 402 043 032	57,6%	246 500 486	10,1%
MPSVR SR	1 808 615 613	1 800 245 560	99,5%	1 330 577 638	73,6%	610 299 171	33,7%
MŽP SR	1 576 863 107	1 548 678 663	98,2%	1 131 187 035	71,7%	173 853 977	11,0%
MŠVV SR	1 021 277 277	813 352 437	79,6%	708 971 423	69,4%	299 972 049	29,4%
SIEA	896 271 945	790 322 921	88,2%	614 110 864	68,5%	185 917 179	20,7%
MH SR	572 825 210	426 445 992	74,4%	316 746 139	55,3%	73 810 235	12,9%
ÚV SR	437 000 000	428 677 708	98,1%	294 270 882	67,3%	105 801 637	24,2%
MZ SR	364 982 422	297 357 119	81,5%	179 663 903	49,2%	23 501 189	6,4%
MV SR	98 722 821	98 722 821	100,0%	63 968 404	64,8%	38 780 506	39,3%
celkom P SK	12 593 734 933	11 685 666 497	92,8%	8 700 478 368	69,1%	2 565 021 891	20,4%

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 08. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

Graf č. 1 Porovnanie stavu implementácie jednotlivých implementujúcich subjektov k 31. 07. 2026

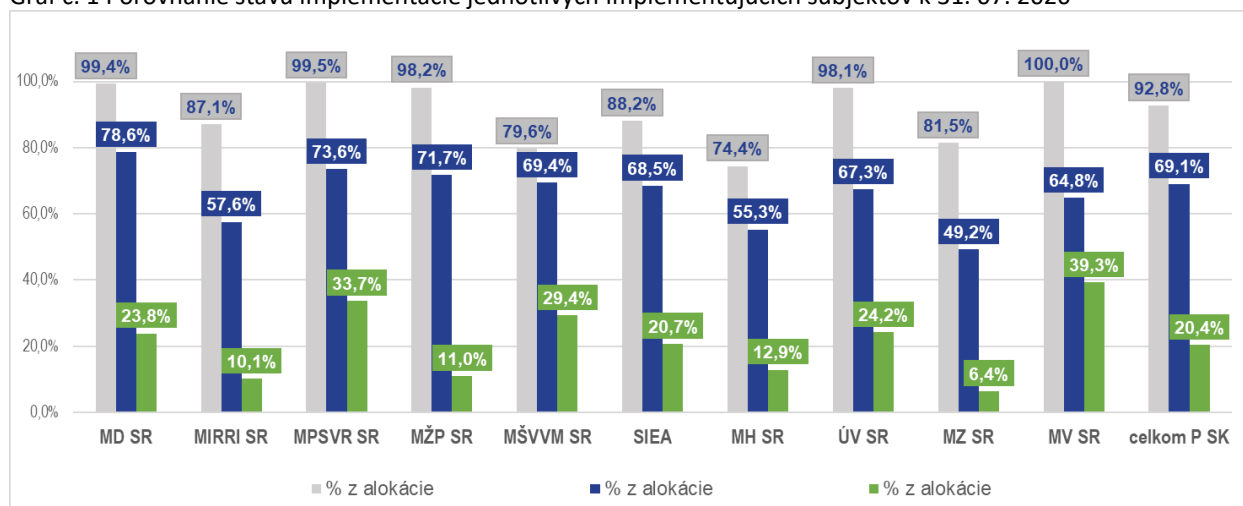

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 08. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

4. Plnenie pravidla N+3

Rok 2025

K 31. 12. 2025 bolo potrebné vyčerpať minimálne 1,47 mld. EUR v rámci P SK.1 Tento limit sa podarilo splniť už k 30. 11. 2025 a k 31. 12. 2025 bolo dosiahnuté 110 %-né plnenie finančného záväzku na rok 2025.

Rok 2026

K 31. 12. 2026 bolo potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21² mld. EUR v rámci P SK. **Finančný záväzok pre rok 2026 bol úspešne naplnený v predstihu, už ku koncu mája 2026, a aktuálne sa čerpá záväzok pre rok 2027.**

Napriek predčasnému splneniu finančného záväzku na rok 2026 zostáva kľúčovou výzvou zabezpečenie dostatočného tempa čerpania v nasledujúcich rokoch. V rokoch 2027 až 2029 bude potrebné každoročne vyčerpať približne 2,09 mld. EUR a v roku 2030 viac ako 4,10 mld. EUR.

Riziko dekomitmentu sa preto bude postupne zvyšovať, najmä ku koncu programového obdobia, keď sa vysoké požiadavky na čerpanie P SK budú prekryvať so začiatkom implementácie programového obdobia 2028 – 2034. Tento tlak môže byť ďalej zvýraznený pripravovaným regulačným rámcom pre obdobie 2028 – 2034, ktorý v aktuálnom návrhu Európskej komisie počíta s uplatňovaním prísnejšieho pravidla N+1.

5. Opatrenia na akceleráciu implementácie

Na eliminovanie rizika dekomitmentu v ďalších rokoch prijíma RO P SK v spolupráci s poskytovateľmi súbor opatrení zameraných na 3 hlavné oblasti:

- revízia P SK a realokácie (v kontexte nových priorít EÚ – MPS a potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe);
- zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK;
- zrýchlenie a transparentnenie procesov VO.

¹ Kumulatívna suma N+3 pre rok 2025 a 2026 bola znížená k 31. 07. 2025 na základe vyplatenia zálohy na STEP (30 % z alokácie 1P3).

² Minimálny objem čerpania v roku 2026 bol výrazne znížený (zníženie o ročnú a dodatočné jednorazové zálohové platby vo výške 1,43 mld. EUR), a to najmä zásluhou využitia nových priorít a flexibilit v rámci nového legislatívneho balíka Európskej únie s názvom „Modernizovaná politika súdržnosti“, prostredníctvom predloženia revízie P SK na schválenie Európskej komisii v termíne do 31. 12. 2025.

5.1 Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov

Jedným z najvýznamnejších opatrení na akceleráciu čerpania a zníženie rizika dekomitmentu bola zmena P SK v súvislosti s Modernizovanou politikou súdržnosti (MPS), ktorú Európska komisia schválila 18. 03. 2026.

Zmena zahŕňala **presun 10 % celkovej alokácie programu na strategické priority MPS** a umožnila získanie **dodatočných zálohových platieb z Európskej komisie** vo výške **1,37 mld. EUR**, čím sa výrazne znížil objem finančných prostriedkov potrebných na splnenie pravidla N+3 pre rok 2026. Súčasne sa **obdobie oprávnenosti** výdavkov **predĺžilo o jeden rok**.

Výzvy v nových prioritách MPS sú priebežne vyhlasované od 2. štvrťroka 2026. V zmysle investičných plánov majú sprostredkovateľské orgány v roku 2026 zakontrahovať 40 % prostriedkov alokovaných na priority MPS.

Aktuálne prebieha schvaľovací proces štvrtej zmeny P SK (verzia 5.1). Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválil návrh zmeny 22. 07. 2026, následne bol návrh predložený Európskej komisii na schválenie. Navrhované zmeny v rámci Programu Slovensko vyplývajú z implementačnej praxe jednotlivých poskytovateľov a majú za cieľ zefektívniť, ako aj urýchliť implementáciu P SK, berúc do úvahy registrovaný dopyt a absorpčnú kapacitu pre jednotlivé oblasti podpory. Zároveň reagujú aj na socioekonomické výzvy, ktorým čelí Slovensko. Navrhovaná zmena P SK má teda finančný, technický, ale aj obsahový charakter zmeny. Všetky zmeny boli premietnuté do Programu Slovensko verzia 5.1 a schválené na MV dňa 22.7.2026.

5.2 Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK

✓ Zintenzívnenie bilaterálnych stretnutí s rizikovými sprostredkovateľskými orgánmi

Bilaterálne stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov sa uskutočňujú v pravidelnej periodicite so sprostredkovateľskými orgánmi, resp. implementačnými sekciami MIRRI SR. Od februára do júla 2026 sa uskutočnilo 6 kôl bilaterálnych stretnutí, spolu 68 rokovaní. Predmetom rokovaní je diskusia k aktuálnemu stavu implementácie, podrobné vyhodnocovanie implementačných dát, identifikovaných rizík a opatrení na zrýchlenie kontrahovania a čerpania.

✓ Zosilnený režim riadenia a monitorovania implementácie FST

V rámci FST pokračuje zosilnený režim monitorovania, pričom sprostredkovateľské orgány a implementačné sekcie MIRRI SR na mesačnej báze aktualizujú odhady čerpania až na úroveň jednotlivých projektov. RO priebežne vyhodnocuje rizikovosť týchto odhadov a sleduje projekty s rizikom nenaplnenia plánovaného čerpania. Vzhľadom na termín deklarovania príslušných výdavkov FST Európskej komisii do 30. 10. 2026 je monitoring zameraný najmä na zabezpečenie včasného vykázania výdavkov. K 31. 07. 2026 nie je identifikované riziko straty finančných prostriedkov FST.

✓ Pokračujúci monitoring kľúčových projektov (národné projekty, finančné nástroje, fázované projekty a projekty nad 5 mil. EUR)

RO priebežne sleduje plnenie plánov, resp. odhadov čerpania kľúčových projektov predkladaných jednotlivými SO a implementačnými sekciami MIRRI SR. Súčasne vyhodnocuje odchýlky od plánovaného čerpania a riziká, ktoré môžu ovplyvniť ďalšiu implementáciu projektov.

✓ Stanovenie a implementácia nových investičných plánov

Investičné plány predstavujú jeden z kľúčových nástrojov RO na riadenie tempa implementácie P SK. Stanovujú limity kontrahovania a čerpania na jednotlivé roky s cieľom zabezpečiť plnenie pravidla N+3 a rozložiť čerpanie tak, aby sa jeho podstatná časť realizovala už v rokoch 2026 – 2029 a nedochádzalo k nadmernej koncentrácii čerpania v závere programového obdobia.

Pri kontrahovaní bol na rok 2026 stanovený cieľ na úrovni 80 % alokácie pôvodných priorít a 40 % alokácie nových priorít MPS, pričom na rok 2027 je cieľom dosiahnuť 100 % kontrahovanie alokácie.

Limity čerpania boli stanovené diferencovane podľa doterajšieho stavu implementácie jednotlivých subjektov a ich plnenia minimálnej hranice čerpania potrebnej na zabezpečenie pravidla N+3. Subjektom s vyššou úrovňou doterajšieho čerpania boli nastavené ambicióznejšie limity (najmä pre rok 2026), pričom pri subjektoch s nižším čerpaním sa zohľadňovala ich reálna implementačná výkonnosť.

Investičné plány **boli sfinalizované** a sú súčasťou dodatkov k zmluvám o poverení medzi RO a sprostredkovateľskými orgánmi. K 31. 07. 2026 boli dodatky podpísané so SIEA, MPSVR SR a MV SR. Ostatné dodatky sú v podpisovom procese.

- ✓ **Priebežný monitoring plnenia mílnika kontrahovania a limitu čerpania N+3 pre rok 2026**
- ✓ **Zintenzívnenie dohľadu na úrovni kontrolných mechanizmov delegovaných právomocí**

S cieľom posilnenia právnej istoty, uistenia o oprávnenosti výdavkov, zachovania zákonnosti a správnosti procesov a predchádzania auditným zisteniam s finančným vplyvom riadiaci orgán posilňuje analytické a kontrolné mechanizmy. Tieto mechanizmy majú preventívny charakter zameraný na ochranu finančných záujmov EÚ a rozpočtu SR a zároveň nápravný charakter, ktorý vychádza z výsledkov vykonaných kontrol delegovaných právomocí.

5.3 Zrýchlenie procesov a zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania

S cieľom zrýchliť a stransparentniť proces kontroly verejného obstarávania boli prijaté viaceré systémové a metodické opatrenia:

- procesná a vecná úprava modelu analýzy rizík verejného obstarávania, na základe ktorého sa určuje výber zákaziek na kontrolu, s účelom cielenejšie zamerať kontrolné kapacity na rizikové zákazky a obmedziť rozsah kontrol pri zákazkách s nízkou mierou rizika, ktorá priniesla najmä eliminovanie všetkých identifikovaných a s partnermi konzultovaných problémov zdržujúcich začiatok kontrolného procesu;
- procesná a vecná úprava príručky ku kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (časť VO), ktorá zaviedla precíznejšie a transparentnejšie procesy a zvýšila prehľad riadiaceho orgánu, ako aj poskytovateľov nad konaním ÚVO ako SO a reflektovala na novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- **MIRRI SR ako riadiaci orgán P SK vytvorilo podmienky na personálne posilnenie SO ÚVO – rozhodnutím ministra bol rámec administratívnych kapacít SO ÚVO navýšený o 40 miest.** Ide o vytvorenie možnosti na prijatie dodatočných kapacít, nie o už realizované zvýšenie počtu zamestnancov ÚVO.
- vydanie novej Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorá vytvára jednotný metodický rámec pre realizáciu a kontrolu VO v rámci P SK. Príručka najmä:
 - ✓ zjednocuje pravidlá realizácie VO a obstarávania vrátane podlimitných zákaziek a zákaziek mimo pôsobnosti zákona o VO;
 - ✓ spresňuje proces kontroly, požadovanú dokumentáciu a postup pri zisteniach vrátane finančných opráv a konfliktu záujmov.
- vypracovanie a implementácia akčného plánu na zefektívnenie kontroly verejného obstarávania a obstarávania v P SK v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 177/2026. Akčný plán je zameraný najmä na:
 - ✓ stanovenie konkrétnych výkonnostných cieľov pre počet a rýchlosť ukončovaných kontrol VO a cieľov pre vyššiu kvalitu a transparentnosť ich realizácie,
 - ✓ zabezpečenie evidencie, správy a poskytovania údajov a dokumentácie súvisiacej s výkonom delegovaných úloh v súlade s požiadavkami RO pre efektívnejší dohľad nad kvalitou, transparentnosťou a efektivitou vykonávaných kontrol zo strany ÚVO ako SO a zároveň za účelom analýzy dát nevyhnutných k validácii modelu rizikovej analýzy;
 - ✓ segmentáciu kontrol a špecializáciu manažérov kontroly VO podľa typu a náročnosti zákaziek;

- ✓ zavedenie prioritácie kontrol podľa ich významu pre implementáciu P SK, čerpanie a plnenie pravidla N+3.

Príloha 1: Stav implementácie P SK k 31. 07. 2026 v rozdelení na ciele politiky a priority

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027	Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie	
				Alokácia EÚ zdroj								
					Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 265 102 507	64	1 135 312 066	89,74%	258	798 789 014	63,14%	117 961 292	9,32%
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	23 709 407	100,00%	1	23 709 407	100,00%	0	0,00%
	1P3	STEP	EFRR	321 022 377	5	69 019 183	21,50%	3	38 976 875	12,14%	0	0,00%
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 1	EFRR	1 631 043 252	70	1 228 040 656	75,29%	262	861 475 297	52,82%	117 961 292	7,23%
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	12	1 153 988 027	94,87%	525	994 395 553	81,75%	493 954 406	40,61%
	2P2	Živočné prostredie	EFRR/KF	1 848 618 253	53	1 874 112 740	101,38%	1 021	1 321 506 476	71,49%	226 441 826	12,25%
	2P3	Udržiateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 853 987	8	864 628 238	102,22%	79	385 867 383	45,62%	136 283 326	16,11%
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	2P5	Dostupné a udržiateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 024 824 528	73	3 892 729 004	96,72%	1 625	2 701 769 412	67,13%	856 679 558	21,28%
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 022 985 448	31	2 334 734 893	115,41%	292	2 058 128 508	101,74%	381 291 448	18,85%
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	2	120 396 911	22,39%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 560 800 221	33	2 455 131 804	95,87%	292	2 058 128 508	80,37%	381 291 448	14,89%
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	528 938 339	28	583 378 784	110,29%	144	449 607 394	85,00%	201 302 630	38,06%
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 514 896	18	606 490 306	93,95%	372	554 826 168	85,95%	277 407 760	42,97%
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	164 840 656	15	148 160 452	89,88%	46	107 969 128	65,50%	21 000 103	12,74%
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	14	225 792 434	78,31%	146	166 195 002	57,64%	41 406 446	14,36%
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	993 626 389	44	1 050 386 158	105,71%	152	824 148 114	82,94%	348 710 792	35,09%
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunít	EFRR/ESF+	279 200 000	13	278 305 110	99,68%	663	196 492 131	70,38%	101 201 366	36,25%
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	6	44 388 164	64,15%	65	35 995 639	52,02%	2 272 534	3,28%
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	69 196 597	100,00%	1	57 173 000	82,62%	10 476 435	15,14%
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	1	30 000 000	40,54%	-	0	0,00%	0	0,00%
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 115 210 625	127	3 036 098 004	97,46%	1 462	2 392 406 576	76,80%	1 003 778 067	32,22%
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	384 847 007	6	384 296 085	99,86%	263	182 350 747	47,38%	24 679 997	6,41%
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 5	EFRR	429 434 284	6	384 296 085	89,49%	263	182 350 747	42,46%	24 679 997	5,75%
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	17	377 200 019	86,68%	67	278 962 273	64,11%	47 484 573	10,91%
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM FST	FST	440 658 242	17	377 200 019	85,60%	67	278 962 273	63,31%	47 484 573	10,78%
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	50	230 381 978	97,63%	62	154 146 076	65,33%	87 278 038	36,99%
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	3	8 581 381	16,62%	3	8 368 114	16,21%	7 652 283	14,82%
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	9	69 017 811	80,43%	12	58 871 619	68,61%	34 312 123	39,99%
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	2	4 189 757	22,82%	2	3 999 747	21,78%	3 904 513	21,27%
		CELKOM TP		391 763 781	64	312 170 926	79,68%	79	225 385 556	57,53%	133 146 957	33,99%
		CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	385	11 685 666 497	92,79%	4 038	8 700 478 368	69,09%	2 565 021 891	20,37%

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 08. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

V prípade, že výzva alebo projekt sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

Príloha 2: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 31. 07. 2026

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027	Prijaté ŽoNFP			Schválené ŽoNFP		
				Alokácia EÚ zdroj						
				Počet ŽoNFP	COV	NFP	Počet ŽoNFP	COV	NFP	
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 265 102 507	768	2 506 817 266	2 264 915 404	335	1 294 347 979	1 219 740 799
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	29 999 376	29 999 376	1	29 999 376	29 999 376
	1P3	STEP	EFRR	321 022 377	37	60 791 335	56 968 648	3	42 799 563	38 976 875
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 1	EFRR	1 631 043 252	806	2 597 607 977	2 351 883 427	339	1 367 146 918	1 288 717 051
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	1 482	2 193 446 097	2 021 793 740	599	1 358 354 473	1 292 281 042
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 618 253	1 642	2 463 505 306	2 332 120 403	1 140	1 795 321 265	1 704 760 257
	2P3	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 853 987	186	831 887 174	816 790 852	147	637 965 315	623 071 848
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0	-	0	0
	2P5	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0	-	0	0
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 024 824 528	3 310	5 488 838 577	5 170 704 995	1 886	3 791 641 054	3 620 113 148
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 022 985 448	577	2 865 821 614	2 842 986 861	341	2 728 175 984	2 709 123 017
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	1	19 858 440	19 858 440	1	19 858 440	19 858 440
		CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 560 800 221	578	2 885 680 054	2 862 845 301	342	2 748 034 424	2 728 981 457
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	528 938 339	468	689 875 797	687 140 280	155	604 486 208	602 108 489
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 514 896	436	739 554 543	712 630 315	401	711 408 782	686 400 812
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	164 840 656	101	162 752 327	159 179 556	48	130 882 216	127 649 346
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	439	341 861 746	339 546 548	152	268 735 086	266 419 888
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	993 626 389	217	1 224 650 223	1 208 934 650	166	1 136 347 567	1 125 752 903
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunít	EFRR/ESF+	279 200 000	807	364 379 735	363 412 274	681	293 521 526	293 521 526
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	121	63 266 299	60 244 491	68	39 653 670	37 812 496
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	63 525 556	63 525 556	1	63 525 556	63 525 556
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	-	0	0	-	0	0
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0	-	0	0
	CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 115 210 625	2 196	3 649 866 226	3 594 613 671	1 541	3 248 560 610	3 203 191 016	
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	384 847 007	446	394 740 011	361 500 718	366	313 738 894	287 900 164
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0	-	0	0
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 5	EFRR	429 434 284	446	394 740 011	361 500 718	366	313 738 894	287 900 164
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	164	707 863 086	517 935 413	106	603 510 290	429 032 459
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM FST	FST	440 658 242	164	707 863 086	517 935 413	106	603 510 290	429 032 459
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	77	246 732 489	245 407 479	63	221 531 118	220 596 750
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	3	12 375 665	12 375 665	3	12 375 665	12 375 665
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	13	91 733 746	91 733 746	12	80 534 100	80 534 100
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	2	5 332 997	5 332 997	2	5 332 997	5 332 997
		CELKOM TP		391 763 781	95	356 174 896	354 849 886	80	319 773 880	318 839 512
		CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	7 572	16 080 770 826	15 214 333 411	4 645	12 392 406 070	11 876 774 807

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 08. 2026); COV= celkové oprávnené výdavky. V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.
