



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Informácia o stave implementácie Programu Slovensko k 06. 03. 2026

## Obsah

1. Základné informácie o Programe Slovensko.....	3
2. Aktuálny stav implementácie P SK k 06. 03. 2026 a pokrok od 17. 10. 2025 .....	4
3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty.....	4
4. Plnenie pravidla N+3.....	5
5. Vybrané implementačné problémy P SK .....	6
6. Opatrenia na akceleráciu čerpania.....	8

## 1. Základné informácie o Programe Slovensko

**Program Slovensko (ďalej len „P SK“) je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. P SK upravuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027.**

Prostredníctvom P SK sa realizujú investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu + (ďalej len „ESF+“), Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) a Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“). P SK nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

V rámci P SK sa podarilo presadiť, že **2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR** (t. j. 19,15 %) je realizovaných cez **mechanizmus integrovaných územných investícií** (ďalej len „ÚI“), ktoré reprezentujú pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania a prioritizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch Európskej únie. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú základnými predpokladmi

- a) územná dohoda o potrebe investície a
- b) pripravenosť projektov.

**Riadiacim orgánom** pre P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“). **Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky** (ďalej len „MF SR“). Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev, respektíve výber a implementácia projektov, poveril riadiaci orgán pre P SK **10 sprostredkovateľských orgánov**, ktorými sú:

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
4. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVM SR“),
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
8. Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“), a to za oblasť podpory rómskych komunit,
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), a to za oblasť výkonu kontroly verejného obstarávania,
10. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“).

Tabuľka č. 1 Rozdelenie alokácie v rámci P SK (v EUR)

Implementujúci subjekt	Alokácia
MD SR	3 384 282 748
MIRRI SR	2 432 893 790
MPSVR SR	1 812 615 613
MŽP SR	1 576 863 107
MŠVVM SR	1 021 277 277

SIEA	896 271 945
MH SR	572 825 210
ÚV SR	431 500 000
MZ SR	366 482 422
MV SR	98 722 821
<b>Spolu Program Slovensko</b>	<b>12 593 734 933</b>

Zdroj: Riadiaci orgán pre P SK - Alokácie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov platné od 25.02.2026 (podľa Finančného plánu v. 4.1)

Investície z P SK smerujú do oblastí podpory/priorít **v 5 cieľoch politiky súdržnosti Európskej únie a 1 samostatného špecifického cieľa:**

- CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
- CP2 – Zeleňšia, nízkouhlíková a odolná Európa
- CP3 – Prepojenejšia Európa
- CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
- CP5 – Európa bližšie k občanom
- Fond na spravodlivú transformáciu

## 2. Aktuálny stav implementácie P SK k 06. 03. 2026 a pokrok od 17. 10. 2025

**Alokácia:** 12,59 mld. EUR  
**Vyhlásené výzvy:** 351 v objeme 11,11 mld. EUR, t.j. 88,21 % alokácie  
**Kontrahovanie:** 7,88 mld. EUR, t.j. 62,54 % alokácie  
**Čerpanie:** 1,87 mld. EUR, t.j. 14,86 % alokácie  
**Počet predložených žiadostí:** 7 053, z ktorých bolo zatiaľ **schválených 3 984.**

### **Pokrok od 17. 10. 2025:**

- **Nárast vo vyhlásených výzvach o 22 výziev vo výške 555,74 mil. EUR (z 83,8 % na 88,2 %)**
- **Nárast kontrahovania o 1,93 mld. EUR (zo 47,2 % na 62,5 %)**
- **Nárast čerpania o 464,44 mil. EUR (z 11,2 % na 14,9 %)**

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

## 3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu pre P SK sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola riadiacim orgánom pre P SK pridelená jednotlivým sprostredkovateľským orgánom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK.


**Na implementácii P SK sa podieľa spolu 10 implementujúcich subjektov (sprostredkovateľských orgánov).**

Tabuľka č. 2 Prehľad stavu implementácie P SK podľa jednotlivých implementujúcich subjektov k 06. 03. 2026

Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy		Kontrahovanie		Čerpanie	
		EÚ zdroj	%z alokácie	EÚ zdroj	%z alokácie	EÚ zdroj	%z alokácie
MD SR	3 384 282 748	3 081 935 822	91,07%	2 471 877 327	73,04%	555 933 688	16,43%
MIRRI SR	2 432 893 790	2 030 169 502	83,45%	1 175 994 107	48,34%	141 700 672	5,82%
MPSVR SR	1 812 615 613	1 787 027 212	98,59%	1 279 795 288	70,60%	475 100 627	26,21%
MŽP SR	1 576 863 107	1 507 953 361	95,63%	1 003 410 036	63,63%	140 354 322	8,90%
MŠVVM SR	1 021 277 277	752 763 128	73,71%	671 251 968	65,73%	247 578 188	24,24%
SIEA	896 271 945	786 252 035	87,72%	499 024 260	55,68%	136 131 139	15,19%
MH SR	572 825 210	411 523 414	71,84%	280 046 482	48,89%	66 909 775	11,68%
ÚV SR	431 500 000	367 299 563	85,12%	263 015 137	60,95%	80 273 287	18,60%
MZ SR	366 482 422	294 155 032	80,26%	164 072 051	44,77%	11 786 951	3,22%
MV SR	98 722 821	90 171 102	91,34%	67 490 777	68,36%	16 048 135	16,26%
<b>celkom P SK</b>	<b>12 593 734 933</b>	<b>11 109 250 171</b>	<b>88,21%</b>	<b>7 875 977 433</b>	<b>62,54%</b>	<b>1 871 816 784</b>	<b>14,86%</b>

Zdroj: ITMS21+ (export dát 09. 03. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

Graf č. 1 Porovnanie stavu implementácie jednotlivých implementujúcich subjektov k 06. 03. 2026

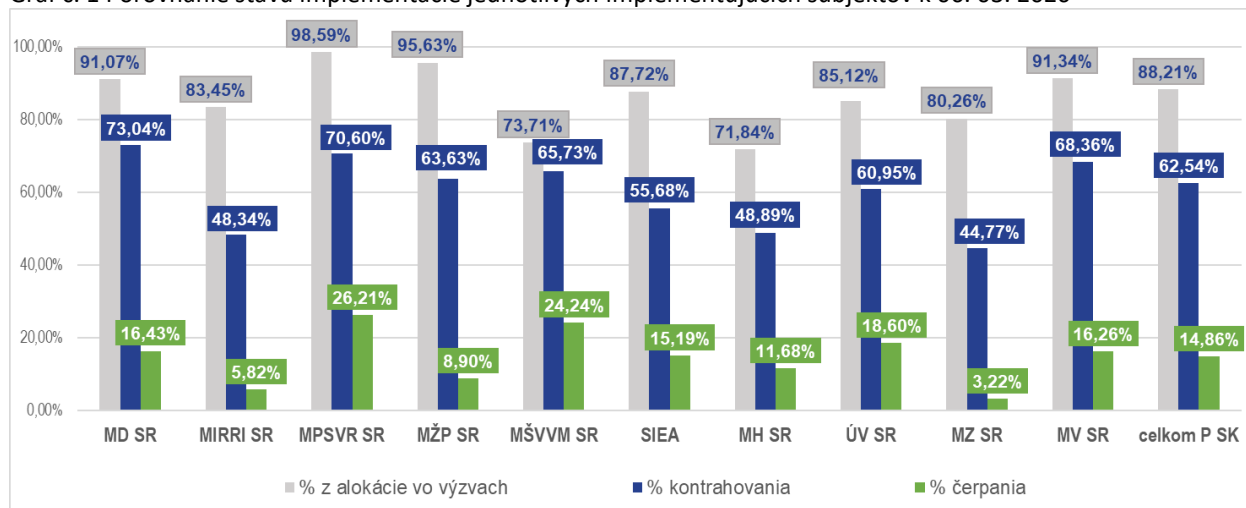

Zdroj: ITMS21+ (export dát 09. 03. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

#### 4. Plnenie pravidla N+3

##### Rok 2025

K 31. 12. 2025 bolo potrebné vyčerpať minimálne 1,47 mld. EUR v rámci P SK.<sup>1</sup> Tento limit sa podarilo splniť už k 30. 11. 2025 a k 31. 12. 2025 bolo dosiahnuté 110 %-né plnenie finančného záväzku na rok 2025.

<sup>1</sup> Kumulatívna suma N+3 pre rok 2025 a 2026 bola znížená k 31. 07. 2025 na základe vyplatenia zálohy na STEP (30 % z alokácie 1P3)

## Rok 2026

**K 31. 12. 2026 bude potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21 mld. EUR v rámci P SK. Aktuálne ostáva vyčerpať ešte 340 mil. EUR.** Minimálny objem čerpania v roku 2026 bol výrazne znížený,<sup>2</sup> a to najmä zásluhou využitia nových priorít a flexibilit v rámci nového legislatívneho balíka Európskej únie s názvom „Modernizovaná politika súdržnosti“, prostredníctvom predloženia revízie P SK na schválenie Európskej komisii v termíne do 31. 12. 2025.

## 5. Vybrané implementačné problémy P SK

### Nízke kontrahovanie alokácie Programu Slovensko

K 06. 03. 2026 dosahuje kontrahovanie P SK (bez technickej pomoci) 62,79 % alokácie. Napriek zlepšeniu pretrváva neproporčné kontrahovanie medzi jednotlivými fondmi, najmä v prípade EFRR (48,54 %) a FST (57,65 %), ktoré zaostávajú za celkovým kontrahovaním P SK. Aj keď kontrahovanie KF výrazne vzrástlo (91,43 %, a to najmä v dôsledku zazmluvnenia veľkých dopravných projektov), kontrahovanie EFRR je stále o 14,25 p. b. pod priemerom P SK, čo predstavuje približne 1 mld. EUR nezazmluvnených finančných prostriedkov. Keďže sa nachádzame už v šiestom roku implementácie P SK, súčasné tempo kontrahovania nie je dostatočné. Do 100 % zazmluvnenia alokácie P SK (bez TP) zostáva zazmluvniť projekty v objeme 4,54 mld. EUR, čo môže (vzhľadom na časovú náročnosť hodnotenia projektov a verejného obstarávania) spomaliť čerpanie v rokoch 2026 – 2027 a zvýšiť riziko dekomitmentu podľa pravidla N+3.

### Nízke čerpanie zakontrahovaných národných projektov

Za čerpanie a implementáciu NP sú priamo zodpovedné najmä ústredné orgány štátnej správy a ich priamo riadené organizácie, ktoré sú častokrát rovnaké, ako samotní poskytovatelia. A preto je potenciál urýchlenia implementácie a čerpania najvyšší pri národných projektoch. K 06. 03. 2026 bolo vyhlásených **151 výziev na národné projekty** v objeme **4,79 mld. EUR**, pričom zazmluvnených je **133 projektov v sume 4,05 mld. EUR**. Čerpanie však nastalo len pri **90 projektoch**, pričom až **43 projektov v objeme 1,81 mld. EUR (44,72 % zo zakontrahovaných NP)** zatiaľ nevykazuje žiadne čerpanie. Z toho **9 projektov bolo zazmluvnených ešte v roku 2024**. Keďže národné projekty tvoria približne **polovicu kontrahovania P SK**, ich pomalý nábeh predstavuje významnú bariéru pre zrýchlenie celkového čerpania programu.

### Neproporčné čerpanie medzi sprostredkovateľskými orgánmi a pomalý nábeh IÚI

Splnenie pravidla N+3 v roku 2025 bolo do veľkej miery zabezpečené nadštandardným čerpaním niektorých implementujúcich subjektov, ktoré kompenzovali nižší výkon ostatných implementujúcich subjektov. Takéto neproporčné čerpanie však nie je dlhodobu udržateľné. Osobitným problémom je implementácia IÚI, kde je čerpanie na úrovni len 4,00 % alokácie. Alokácia finančných prostriedkov pre IÚI pritom predstavuje približne 2,4 mld. EUR, teda takmer pätinu alokácie P SK, a preto ich pomalý nábeh významne ovplyvňuje celkové tempo implementácie P SK.

### Riziko plnenia pravidla N+3 v ďalších rokoch

Výraznejšie riziko dekomitmentu sa presúva do rokov 2027 – 2029, keď bude potrebné každoročne čerpať priemerne 2,09 mld. EUR, čo pri súčasnom tempe implementácie P SK

---

<sup>2</sup> Zníženie o ročnú a dodatočné jednorazové zálohové platby vo výške 1,43 mld. EUR.

predstavuje významnú výzvu. **Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj začiatok implementácie nového programového obdobia 2028 – 2034, čo bude najmä v rokoch 2028 až 2030 znamenať prelínanie dvoch programových období, a tým vytvárať tlak na ešte vyššiu úroveň ročného čerpania finančných prostriedkov.**

### **Neuspokojivý stav implementácie projektov informatizácie v gescii MIRRI SR**

Implementácia projektov informatizácie v gescii MIRRI SR je výrazne pod priemerom P SK. Čerpanie dosahuje len **1,37 % alokácie, kontrahovanie len 44,36 % alokácie. Veľká časť zakontrahovaných projektov** nemá doteraz ukončené žiadne verejné obstarávanie. Vzhľadom na vyššie uvedené pomalé kontrahovanie a vyhlasovanie výziev predstavuje extrémne riziko kumulácie **výdavkov na konci programového obdobia a minimálny prínos pre čerpanie v kritických rokoch 2027 a 2028.**

### **Neuspokojivý stav implementácie projektov MZ SR**

MZ SR je v kontrahovaní a čerpaní najslabšie spomedzi všetkých sprostredkovateľských orgánov. **Čerpanie dosahuje len 11,79 mil. EUR, čo predstavuje 3,22 % alokácie, (čerpanie P SK je 14,86 %). Kontrahovanie je na úrovni 164,07 mil. EUR, čo predstavuje len 44,77 % alokácie (kontrahovanie P SK je na úrovni 62,54 %).** Bez výrazného zrýchlenia kontrahovania v roku 2026 sa projekty dostanú do oneskoreného čerpania, čo zvyšuje riziko **kumulácie výdavkov na konci programového obdobia, resp. nedočerpania pridelenej alokácie.**

### **Neuspokojivý stav implementácie projektov financovaných z EFRR v gescii ÚV SR**

Čerpanie projektov EFRR v gescii ÚV SR je zatiaľ **minimálne – 0,45 % alokácie, kontrahovanie je na úrovni 46,37 % alokácie.** Rizikom je **časovo náročný proces verejného obstarávania pri infraštruktúrnych projektoch pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami.** Ak sa nepodarí urýchliť zazmluvnenie projektov v rámci EFRR, tak, aby bola využitá stavebná sezóna **2026, hrozí nedostatok projektov generujúcich výdavky v ďalších rokoch implementácie P SK.** Celkové čerpanie ÚV SR je nadpriemerné najmä vďaka čerpaniu ESF+.

### **Neuspokojivý stav implementácie projektov financovaných z FST**

FST implementujú štyri subjekty - **MIRRI SR, MH SR, SIEA a MPSVR SR.**

Kontrahovanie za FST (bez TP) je mierne podpriemerné (57,65 %, P SK bez TP 62,79 %). Väčším rizikom je však čerpanie, ktoré je najnižšie spomedzi všetkých fondov (6,05 %, P SK bez TP 14,50 %). Zároveň je podľa pravidiel pre FST (čl. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu), za účelom splnenia podmienky vyplatenia 100 % prostriedkov alokovaných na FST, potrebné deklarovat oprávnené výdavky Európskej komisii do 30. 10. 2026 tak, aby Európska komisia tieto prostriedky uhradila členskému štátu do 31. 12. 2026, čo skracuje obdobie oproti ostatným fondom o 2 mesiace.

### **Dlhé lehoty na výkon kontroly zo strany ÚVO**

Aj napriek naplneniu obsadenosti systemizovaných pracovných miest určených na výkon úloh sprostredkovateľských orgánov podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 488 z 27. 09. 2023 k stanoveniu počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 a nastaveniu systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021 – 2027 sa ÚVO nedarí realizovať výkon

kontroly v stanovených lehotách, čo má za následok spomalenie procesov implementácie pri niektorých projektoch.

## 6. Opatrenia na akceleráciu čerpania

**Na zabezpečenie splnenia pravidla N+3 v roku 2025 a eliminovanie rizika dekomitmentu v roku 2026** prijíma riadiaci orgán pre P SK v spolupráci s implementujúcimi subjektami **súbor opatrení zameraných na 3 hlavné oblasti:**

- revízia P SK a realokácie [v kontexte nových priorít Európskej únie – Modernizovaná politika súdržnosti (ďalej len „MPS“) a potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe];
- akcelerácia kontrahovania a čerpania;
- zrýchlenie procesov verejného obstarávania.

### ✓ **Zmena P SK a realokácia finančných prostriedkov**

Zmena P SK bola pripravená v nadväznosti na prijatie legislatívneho balíka k MPS, konkrétne Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, ktoré nadobudli účinnosť 20. 09. 2025. Zmena P SK zahŕňa presun 10 % celkovej alokácie P SK na strategické priority MPS, ako aj ďalšie úpravy vyplývajúce z implementačnej praxe jednotlivých poskytovateľov. Týmito opatreniami boli vytvorené maximálne predpoklady na to, aby v roku 2026 nedošlo k trvalej strate finančných prostriedkov Európskej únie v odhadovanej výške približne 750 mil. EUR. Tento cieľ sa dosiahne najmä získaním zálohových platieb z Európskej komisie vo výške 1,43 mld. EUR, ktoré priamo znižujú objem finančných prostriedkov potrebných na vyčerpanie v roku 2025 a 2026. Zároveň sa vytvára predpoklad na úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške približne 420 mil. EUR na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s „*energopomocou*“, a to umožnením podpory financovania výstavby nemocnice v Prešove zo zdrojov P SK. Súčasne sa obdobie oprávnenosti výdavkov predlžuje o 1 rok, čím sa vytvára dostatočný časový priestor na realizáciu projektov.

**Finálne schválenie** zmeneného P SK Európskou komisiou sa predpokladá **v priebehu marca 2026**. Riadiaci orgán pre P SK zároveň aktívne spolupracuje s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť **včasné spustenie investícií do nových priorít MPS**.

### ✓ **Zvýšenie kontrahovania**

**Zakontrahovanie schválených a predložených fázovaných a národných projektov.** Ukončenie hodnotiacich a výberových procesov pre všetky predložené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) národných projektov. Priebežné vyhodnocovanie v odpočtoch vlády SR.

### ✓ **Zintenzívnenie bilaterálnych stretnutí s rizikovými sprostredkovateľskými orgánmi**

Aktuálne prebiehajú bilaterálne stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov v mesačnej periodicite.

### ✓ **Priebežný monitoring plnenia míľníka kontrahovania a limitu čerpania N+3 pre rok 2026**

✓ **Pokračujúca prioritizácia kľúčových projektov**

Aj v roku 2026 prebieha pravidelné sledovanie plnenia plánov čerpania podľa jednotlivých implementujúcich subjektov.

✓ **Zrýchlenie verejného obstarávania (VO)**

Problém s nedostatočnými administratívnymi kapacitami na strane ÚVO **bol odstránený**. K **dnešnému dňu sú kapacity naplnené takmer na 100 %**. Výzvou naďalej zostáva zvýšenie výkonnosti týchto kapacít, najmä z hľadiska rýchlosti realizácie kontrol verejného obstarávania. Aj preto bol v oblasti kontroly verejného obstarávania bol upravený model hodnotenia rizík s cieľom zrýchliť implementáciu a odstrániť administratívne brzdy. Kontrola zákaziek sa realizuje na základe analýzy rizík. Náhodný výber je jej súčasťou a predstavuje vzorku prevažne nízkorizikových zákaziek. V rámci úpravy modelu bol prehodnotený celý prístup – procesne aj vecne – aby sa odstránili nejasnosti, ktoré v minulosti spôsobovali zdržania. Nový model rizík bol prepracovaný na základe širokej koordinácie s partnermi a sprostredkovateľskými orgánmi. Za účelom zrýchlenia implementačných procesov v čase rekonštrukcie modelu analýzy rizík vydal riadiaci orgán v druhej polovici roka 2025 celý rad individuálnych usmernení a v decembri 2025 taktiež systémové usmernenie smerujúce k výraznému zrýchleniu implementačných procesov a taktiež k eliminácii nedorozumení v súvislosti s vyplňaním modelu analýzy rizík a postupov sprostredkovateľských orgánov, vrátane ÚVO.

Aktuálne prebieha finalizácia metodických materiálov, pričom ich predloženie do medzirezortného pripomienkového konania sa očakáva v najbližšom období.

Riadiaci orgán zároveň priebežne spolupracuje s ÚVO prostredníctvom zintenzívneného dohľadu a pravidelných koordinačných stretnutí, aby sa minimalizovali implementačné riziká a zabezpečila predvídateľnosť kontrolného procesu.

## Príloha 1: Stav implementácie P SK k 06. 03. 2026 v rozdelení na ciele politiky a priority

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027		Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie	
				Alokácia EÚ zdroj	Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 270 387 042	60	1 127 509 987	88,75%	203	700 123 386	55,11%	80 980 491	6,37%	
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	23 709 407	100,00%	1	23 709 407	100,00%	0	0,00%	
	1P3	STEP	EFRR	231 782 399	2	39 000 000	16,83%	1	9 991 432	4,31%	0	0,00%	
	1P4	STEP - MPS	EFRR	84 155 689	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM cieľ 1</b>		<b>EFRR</b>	<b>1 631 243 498</b>	<b>63</b>	<b>1 190 219 394</b>	<b>72,96%</b>	<b>205</b>	<b>733 824 225</b>	<b>44,99%</b>	<b>80 980 491</b>	<b>4,96%</b>	
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	13	1 149 917 141	94,53%	322	883 795 646	72,65%	351 927 436	28,93%	
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 486 069	52	1 752 527 308	94,81%	883	1 166 700 873	63,12%	161 338 287	8,73%	
	2P3	Udržiateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 736 498	8	852 303 964	100,78%	46	328 592 644	38,85%	109 141 372	12,90%	
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	2P5	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM cieľ 2</b>		<b>EFRR/KF</b>	<b>4 024 574 855</b>	<b>73</b>	<b>3 754 748 413</b>	<b>93,30%</b>	<b>1 251</b>	<b>2 379 089 162</b>	<b>59,11%</b>	<b>622 407 095</b>	<b>15,47%</b>	
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 024 548 122	25	2 151 304 982	106,26%	264	1 892 515 995	93,48%	238 324 475	11,77%	
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM cieľ 3</b>		<b>EFRR/KF</b>	<b>2 562 362 895</b>	<b>25</b>	<b>2 151 304 982</b>	<b>83,96%</b>	<b>264</b>	<b>1 892 515 995</b>	<b>73,86%</b>	<b>238 324 475</b>	<b>9,30%</b>	
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	532 938 339	25	563 275 723	105,69%	142	455 235 581	85,42%	164 123 450	30,80%	
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 632 672	18	605 966 027	93,86%	291	501 291 212	77,64%	230 341 022	35,68%	
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	190 840 656	13	112 230 954	58,81%	36	101 740 970	53,31%	14 854 798	7,78%	
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	12	269 619 004	93,51%	146	142 915 658	49,57%	27 131 000	9,41%	
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	969 126 389	42	1 082 364 236	111,68%	120	799 407 154	82,49%	264 419 309	27,28%	
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunit	EFRR/ESF+	273 700 000	11	258 965 165	94,62%	656	195 062 099	71,27%	79 780 938	29,15%	
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	5	37 388 164	54,03%	46	24 599 585	35,55%	663 717	0,96%	
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	57 173 000	82,62%	1	57 173 000	82,62%	10 000 191	14,45%	
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM cieľ 4</b>		<b>EFRR/ESF+</b>	<b>3 115 328 401</b>	<b>115</b>	<b>2 986 982 273</b>	<b>95,88%</b>	<b>1 311</b>	<b>2 277 425 259</b>	<b>73,10%</b>	<b>791 314 425</b>	<b>25,40%</b>	
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	383 215 984	6	354 923 304	92,62%	139	124 574 137	32,51%	9 617 670	2,51%	
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM cieľ 5</b>		<b>EFRR</b>	<b>427 803 261</b>	<b>6</b>	<b>354 923 304</b>	<b>82,96%</b>	<b>139</b>	<b>124 574 137</b>	<b>29,12%</b>	<b>9 617 670</b>	<b>2,25%</b>	
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	17	380 358 809	87,41%	52	254 040 444	58,38%	26 671 632	6,13%	
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%	
	<b>CELKOM FST</b>		<b>FST</b>	<b>440 658 242</b>	<b>17</b>	<b>380 358 809</b>	<b>86,32%</b>	<b>52</b>	<b>254 040 444</b>	<b>57,65%</b>	<b>26 671 632</b>	<b>6,05%</b>	
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	46	209 782 110	88,90%	57	143 268 729	60,72%	62 146 125	26,34%	
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	2	8 368 114	16,21%	3	8 368 114	16,21%	7 652 283	14,82%	
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	8	68 563 025	79,90%	12	58 871 619	68,61%	28 798 076	33,56%	
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	1	3 999 747	21,78%	2	3 999 747	21,78%	3 904 513	21,27%	
	<b>CELKOM TP</b>			<b>391 763 781</b>	<b>57</b>	<b>290 712 996</b>	<b>74,21%</b>	<b>74</b>	<b>214 508 209</b>	<b>54,75%</b>	<b>102 500 996</b>	<b>26,16%</b>	
<b>CELKOM PROGRAM SLOVENSKO</b>				<b>12 593 734 933</b>	<b>351</b>	<b>11 109 250 171</b>	<b>88,21%</b>	<b>3 291</b>	<b>7 875 977 433</b>	<b>62,54%</b>	<b>1 871 816 784</b>	<b>14,86%</b>	

Zdroj: ITMS21+ (export dát 09. 03. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

V prípade, že výzva, ŽoNFP alebo projekt sa týka viacerých priorít/cielov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

## Príloha 2: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 06. 03. 2026

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027		Prijaté ŽoNFP			Schválené ŽoNFP		
				Alokácia EÚ zdroj	Počet ŽoNFP	COV	NFP	Počet ŽoNFP	COV	NFP	
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 270 387 042	746	2 398 409 504	2 159 936 378	234	1 080 553 882	1 026 866 856	
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	29 999 376	29 999 376	1	29 999 376	29 999 376	
	1P3	STEP	EFRR	231 782 399	3	42 811 608	38 988 920	2	24 814 120	20 991 432	
	1P4	STEP - MPS	EFRR	84 155 689	-	0	0	-	0	0	
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM cieľ 1</b>	<b>EFRR</b>	<b>1 631 243 498</b>	<b>750</b>	<b>2 471 220 487</b>	<b>2 228 924 674</b>	<b>237</b>	<b>1 135 367 378</b>	<b>1 077 857 664</b>	
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	1 410	2 159 824 037	2 003 650 579	482	1 204 181 744	1 161 541 970	
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 486 069	1 528	2 267 192 598	2 140 445 308	1 038	1 644 395 861	1 561 616 873	
	2P3	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 736 498	141	761 063 484	746 327 549	94	567 334 955	552 667 750	
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0	-	0	0	
	2P5	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0	-	0	0	
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM cieľ 2</b>	<b>EFRR/KF</b>	<b>4 024 574 855</b>	<b>3 079</b>	<b>5 188 080 119</b>	<b>4 890 423 437</b>	<b>1 614</b>	<b>3 415 912 559</b>	<b>3 275 826 594</b>	
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 024 548 122	528	2 637 127 445	2 615 929 141	306	2 441 014 186	2 423 465 512	
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM cieľ 3</b>	<b>EFRR/KF</b>	<b>2 562 362 895</b>	<b>528</b>	<b>2 637 127 445</b>	<b>2 615 929 141</b>	<b>306</b>	<b>2 441 014 186</b>	<b>2 423 465 512</b>	
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	532 938 339	450	660 809 052	658 448 993	147	580 020 724	577 737 981	
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 632 672	421	727 263 056	701 526 717	350	675 122 017	651 432 915	
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	190 840 656	100	148 009 890	144 437 119	43	128 669 742	125 613 869	
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	437	329 874 558	327 559 360	150	256 747 898	254 432 701	
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	969 126 389	191	1 174 464 051	1 161 129 985	141	1 101 861 919	1 093 988 224	
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunit	EFRR/ESF+	273 700 000	758	355 911 808	355 911 808	670	279 541 697	279 541 697	
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	108	56 096 572	53 433 250	67	39 353 331	37 527 174	
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	63 525 556	63 525 556	1	63 525 556	63 525 556	
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	-	0	0	-	0	0	
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM cieľ 4</b>	<b>EFRR/ESF+</b>	<b>3 115 328 401</b>	<b>2 073</b>	<b>3 515 954 543</b>	<b>3 465 972 787</b>	<b>1 439</b>	<b>3 124 842 884</b>	<b>3 083 800 116</b>	
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	383 215 984	394	349 820 292	320 380 414	240	221 431 138	203 384 236	
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0	-	0	0	
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM cieľ 5</b>	<b>EFRR</b>	<b>427 803 261</b>	<b>394</b>	<b>349 820 292</b>	<b>320 380 414</b>	<b>240</b>	<b>221 431 138</b>	<b>203 384 236</b>	
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	159	691 138 982	501 017 206	77	538 824 837	374 721 273	
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0	-	0	0	
		<b>CELKOM FST</b>	<b>FST</b>	<b>440 658 242</b>	<b>159</b>	<b>691 138 982</b>	<b>501 017 206</b>	<b>77</b>	<b>538 824 837</b>	<b>374 721 273</b>	
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	71	240 497 694	239 462 311	63	221 531 118	220 596 750	
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	3	12 375 665	12 375 665	3	12 375 665	12 375 665	
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	13	91 733 746	91 733 746	12	80 534 100	80 534 100	
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	2	5 332 997	5 332 997	2	5 332 997	5 332 997	
		<b>CELKOM TP</b>		<b>391 763 781</b>	<b>89</b>	<b>349 940 101</b>	<b>348 904 718</b>	<b>80</b>	<b>319 773 880</b>	<b>318 839 512</b>	
	<b>CELKOM PROGRAM SLOVENSKO</b>		<b>12 593 734 933</b>	<b>7 053</b>	<b>15 203 281 969</b>	<b>14 371 552 377</b>	<b>3 984</b>	<b>11 197 166 863</b>	<b>10 757 894 905</b>		

Zdroj: ITMS21+, export dát 09. 03. 2026; COV= celkové oprávnené výdavky. V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cielov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.
