




Úsek 3 - HUBOVÁ - IVACHNOVÁ



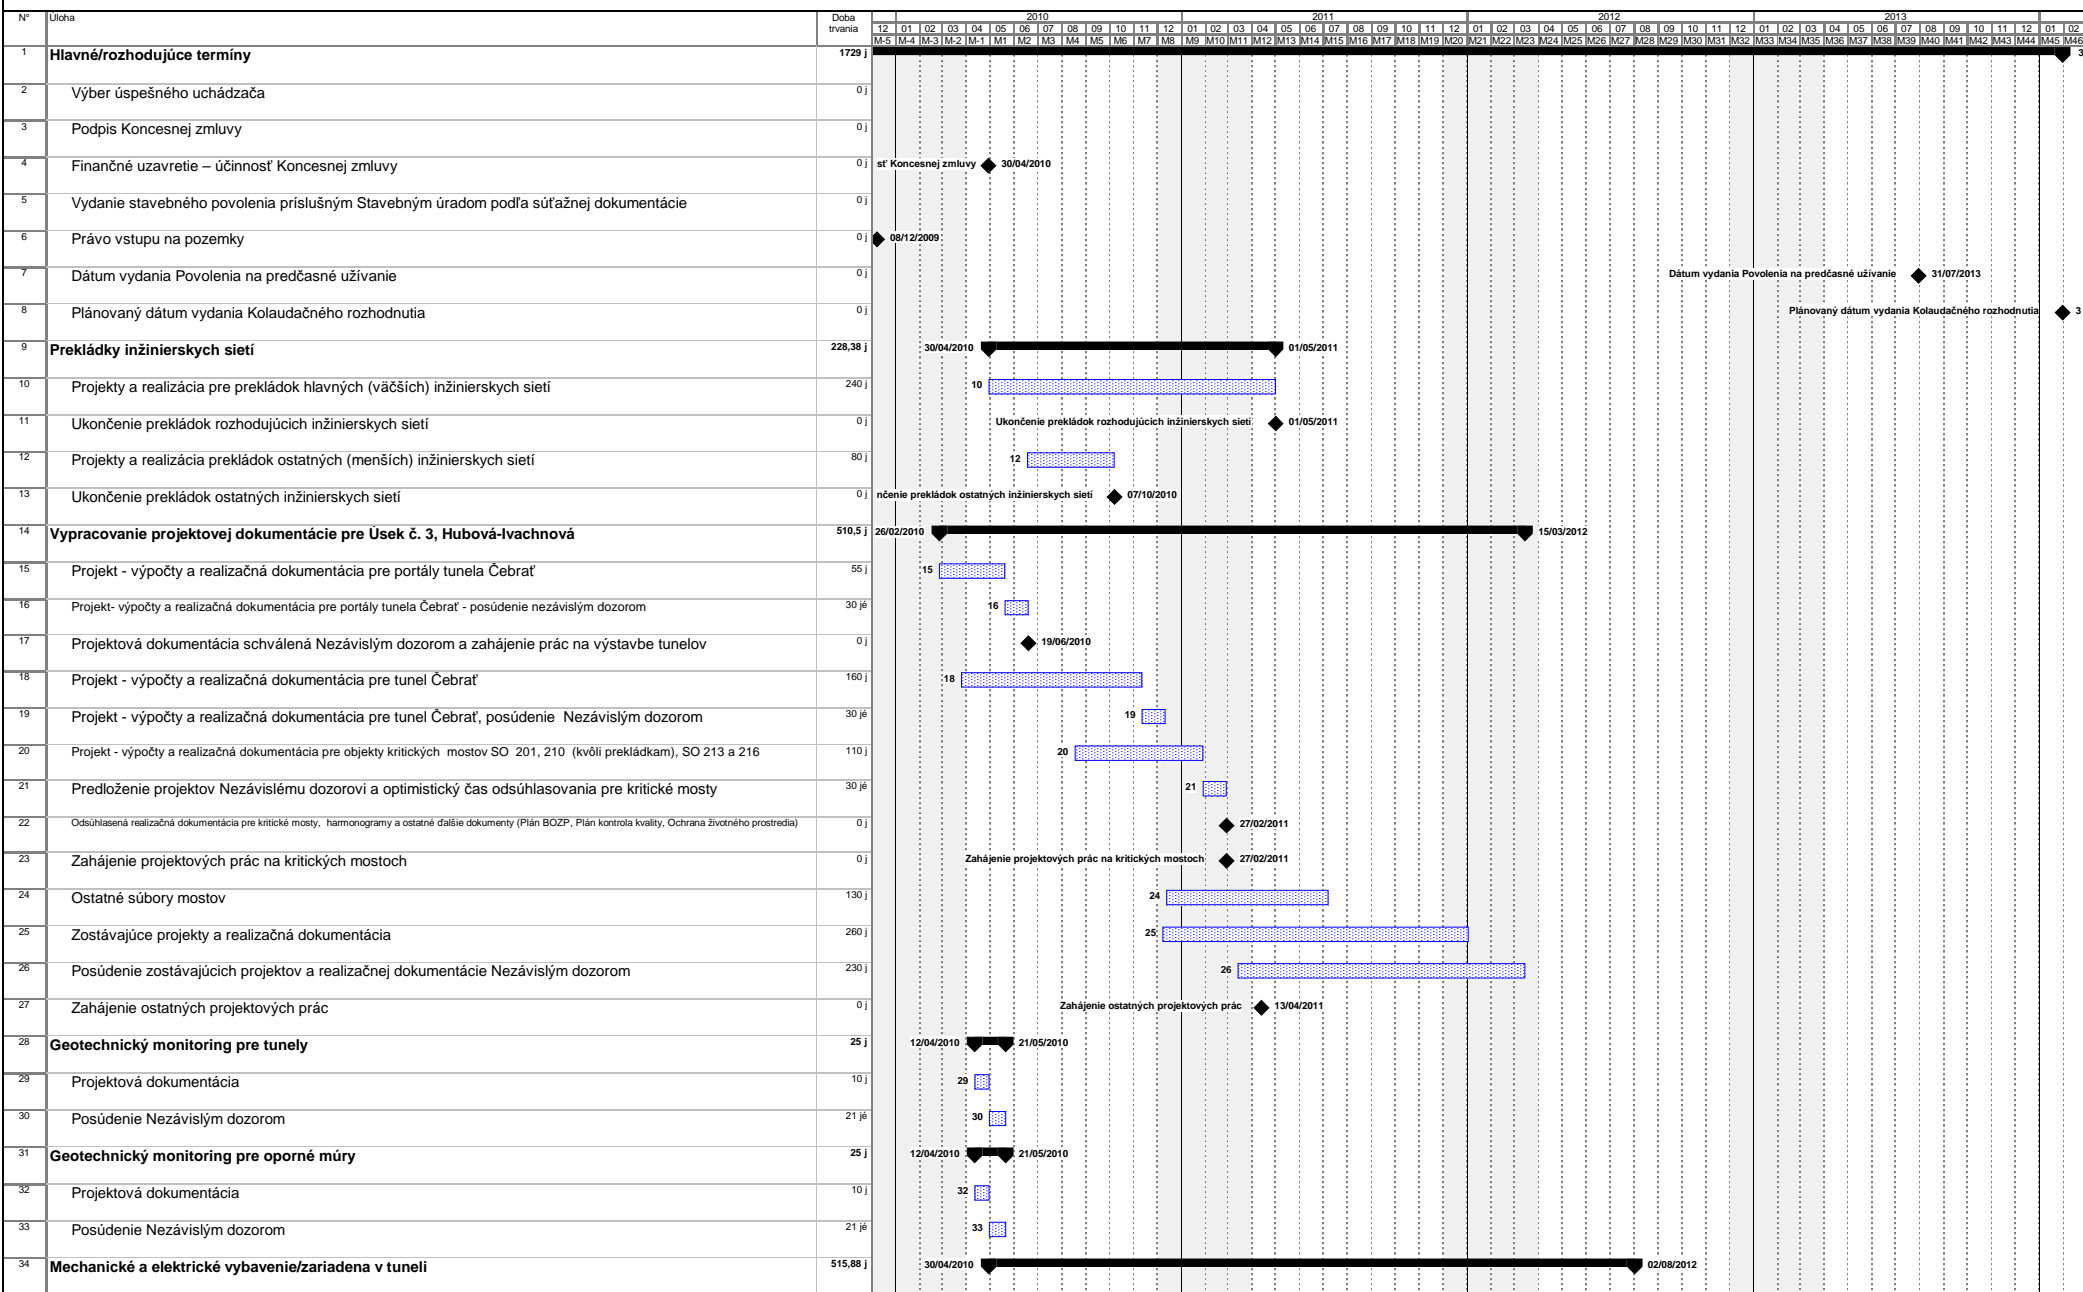

Úsek 3 - HUBOVÁ - IVACHNOVÁ

N°	Učba	Doba trvania	2010												2011												2012												2013											
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
176	Objekty príslušenstva diaľnice	443,25 j	18/06/2011																																															
177	Vegetačné úpravy	38,38 j	10/07/2012																																															
178	Svahovanie a zahumusovanie svahov	30 j	178																																															
179	Zatrávenie, hydroseov a vegetačné úpravy na svahoch	30 j	179																																															
180	Oplotenie diaľnice	21,88 j	23/04/2013																																															
181	Hlavné oplotenie	30 j	181																																															
182	Ďalšie práce súvisiace s oplotením	30 j	182																																															
183	Oporné múry SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244	231,88 j	18/06/2011																																															
184	Zariadenie pre monitoring na oporných múroch	100 j	184																																															
185	Oporné múry SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244	250 j	185																																															
186	Oporné múry SO 230, 232, 233, 235, 236, 237, 243, 246, 247	250 j	186																																															
187	Protihlukové steny SO 250-257, SO 315-318	157,13 j	09/08/2012																																															
188	Zvukové bariéry	160 j	188																																															
189	Ďalšie protihlukové opatrenia	160 j	189																																															
190	ISD (Informačný systém diaľnice) SO 690, 691, 692	168 j	09/08/2012																																															
191	ISD (Informačný systém diaľnice) SO 690, 691, 692	168 j	191																																															
192	Prvky dopravného značenia a zaistenia bezpečnosti premávky	103,38 j	06/12/2012																																															
193	Vodorovné dopravné značenie	8 j	193																																															
194	Zvislé dopravné značky	22,88 j	194																																															
195	Oceľové a betónové (New Jersey) zvodidlá	90,25 j	195																																															
196	Mosty	598,63 j	26/11/2010																																															
197	Základy a piliere pred zahájením prác na mostovke (všetky mosty okrem SO 210)	126 j	197																																															
198	Ukončenie prác na mostovke a mostoch (všetky mosty okrem SO 210)	120 j	198																																															
199	Mostný objekt SO 201 (letná betónáž)	283,88 j	15/06/2011																																															
200	Betónáž mostovkovej dosky	283,88 j	15/06/2011																																															
201	Technológia inkrementálneho vysúvania - 2 páry malých vozíkov	342,25 j	201																																															
202	Technológia inkrementálneho vysúvania- 1 pár stredných vozíkov	198 j	202																																															
203	Mostný objekt SO 204 (letná betónáž)	228,63 j	30/11/2011																																															
204	Betónáž mostovkovej dosky	228,63 j	30/11/2011																																															
205	Zariadenie dovezené z Úseku č.4	0 j	Zariadenie dovezené z Úseku č.4																																															
206	Technológia letmej betónáže - 2 páry malých vozíkov	198 j	206																																															
207	Technológia letmej betónáže - 1 pár malých vozíkov	198 j	207																																															
208	Mostný objekt SO 207 (výsuvná skruž)	226 j	30/10/2011																																															
209	Betónáž mostovkovej dosky	226 j	30/10/2011																																															



Úsek 3 - HUBOVÁ - IVACHNOVÁ

